


ET 25 DE MAYO 500/132 KV 2x300 MVA

Estado de Situación

AVANCE GLOBAL 75%

Últimos hitos alcanzados:

- Montaje electromecánico de playas de 500 kV y 132 kV finalizado
- Montaje y alistamiento de transformadores de potencia finalizado
- Conexión de equipos en alta y extra alta tensión 95%
- Edificios de celdas, tableros y comando 82%
- Tendido de cables multipares 80%
- Puntas conectadas 65%
- Cable de 33 kV en obra, con tendido previsto luego del receso de fin de año (6-ene-2020)
- Se ha emitido la orden de compra para la piedra partida
- Próxima a definir la subcontratación de los pavimentos internos y circundantes
- Permanece pendiente la provisión por parte de TRANSENER de una parte de los tableros (32).
- Prevista en Servicio para mediados de 2020

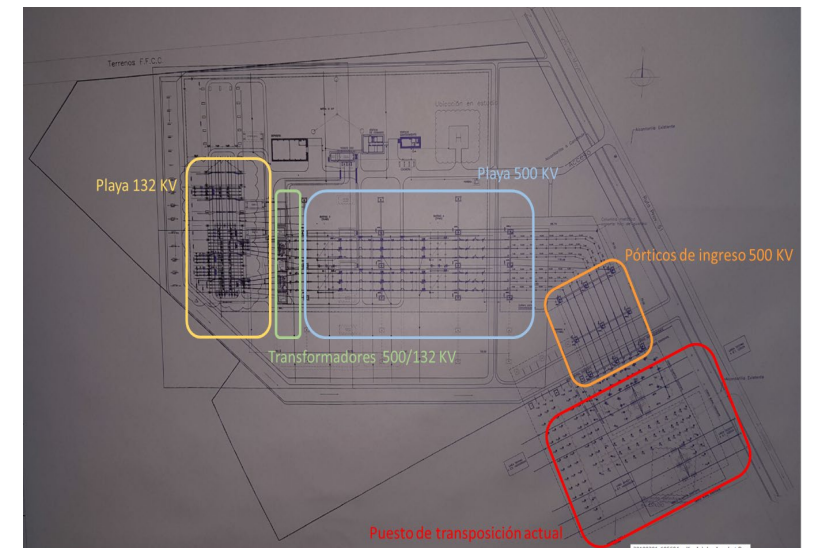

PAGOS REALIZADOS DESDE FITBA – 30 % A CARGO PBA

Obra	Fecha	Conceptos	Pesos	Dólares
ET 25 de Mayo	enero 2014	Provisión de 2 transf. de potencia 500/132 kV (incluye Repuestos, Supervisión de Montaje y Transporte local).		2.855.079,12
		Remuneración TRANSENER		92.949,85
	junio 2015	ABB SA - Tableros de Protecciones, Sistema de Telecontrol y Sistema DAG		987.581,43
		AIT SA - TTII y TTVV 500 kV y 132 kV		345.574,50
		ALSTOM GRID ARGENTINA SA - Interruptores 500 kV y 132 kV, Seccionadores 500 kV y 132 kV y Aisladores 500 kV		1.225.900,37
		SIEMENS SA - Descargadores de sobretensión 500 kV y 132 kV		66.647,89
		Remuneración TRANSENER		79.755,63
	marzo 2017	TEYMA – Obra civil, montaje electromecánico y obras asociadas	110.863.001,33	3.846.027,74
		Totales	110.863.001,33	9.499.516,53












VINCULOS ET 25 DE MAYO 500/132 KV 2x300 MVA
Estado de Situación

AVANCE OBRAS

Estado :

- LAT 132 kV doble terna entre ET 25 de Mayo y LAT 132 kV existente Bragado Saladillo lista para su conexión en ambos extremos.
- Nueva LAT 132 kV entre ET 25 de Mayo y Chivilcoy en proceso de construcción de bases simples y especiales (11 km de avance desde la ET 25 de Mayo)

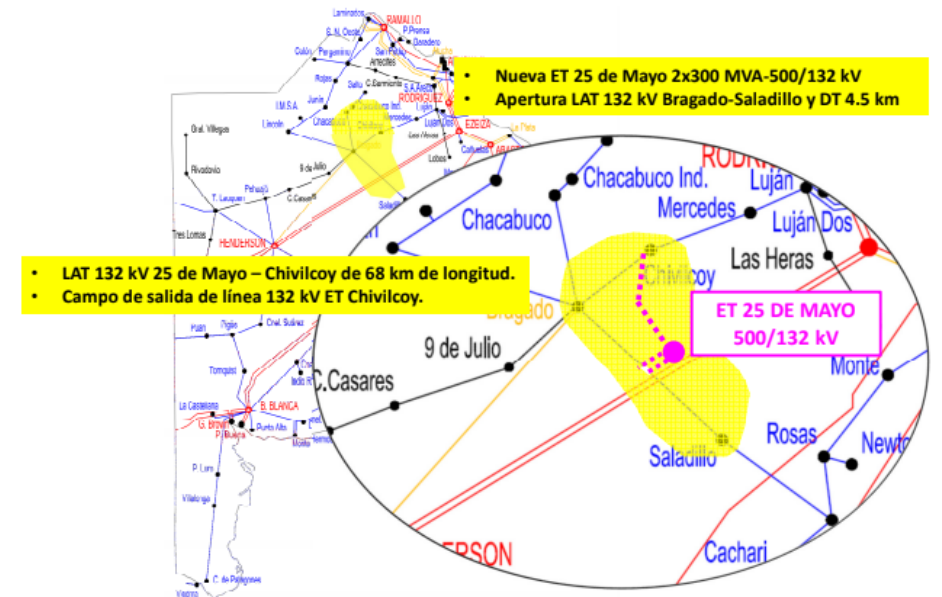

PAGOS REALIZADOS DESDE FITBA – 30 % A CARGO PBA

Obra	Fecha	Conceptos	Pesos	Dólares
Vinculaciones ET 25 de Mayo	julio 2018	Construcción de Nueva LAT 132 kV 25 de Mayo – Chivilcoy Construcción vínculo 4,5 km doble terna 132 kV con LAT Bragado Saladillo existente - PROOBRA	42.643.197,60	3.436.334,54
		Conservación equipamiento depositado en TRANSENER - LUBRISIDER	5.412.860,71	
		Remuneración TRANSENER – Contratos PROOBRA – LUBRISIDER - TEYMA	9.372.757,76	436.941,74
		Totales	57.428.816,07	3.873.276,28











Muchas gracias!

