

OBRAS DEL OESTE

Estado de Situación

Eduardo Ponzano
FREBA


ESTADO DE LAS OBRAS

En servicio:

- LAT Henderson Pehuajó, adecuación ET Henderson y nueva ET Pehuajó – etapa I

En desarrollo:

- **Ampliación ET Pehuajó** (Construcción de barras de 33 kV y acoplamiento longitudinal, dos campos exteriores de 33 kV para los transformadores de potencia existentes e incorporación de nuevas salidas intemperie en 33 kV)
- **LAT 132 kV Pehuajó- Villegas** (Construcción de 144 km de LAT 132 kV; incluye nuevos accesos y Variante Tres Algarrobos)
- **ET Villegas** (Construcción de nueva ET 132/33/13.2 kV; 30/20/30 MVA)
- **Ampliación ET Villegas** (ampliaciones en las barras de 13,2 y 33 kV y obras civiles adicionales en la ET 132/33/13,2 kV)
- En Servicio 2º semestre 2020

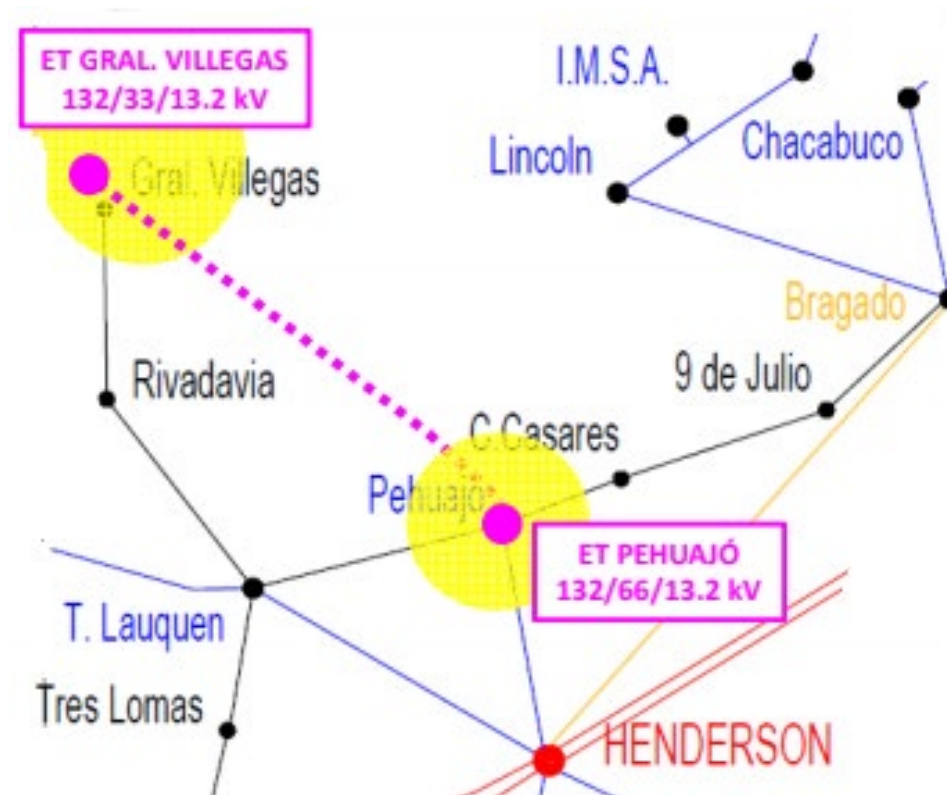

PAGOS INSTRUIDOS Y POR INSTRUIR



Pedido DEBA	Fecha	Instrucción BMyN N°	Desde cuenta	Fecha Instrucción	Importe [€]
D.E. 1064/17	25/11/2019	Por Instruir			\$ 20.102.008,06
D.E. 1048/18	7/11/2019				\$ 16.233.820,45
D.E. 1042/19	23/10/2019	B_L_516_19	Tpte. y S.T. (*)	25/10/2019	\$ 40.072.502,38
D.E. 1040/19	15/10/2019	B_L_479_19	Tpte. y S.T. (*)	30/10/2019	\$ 25.506.249,97
D.E. 282/18	22/7/2019	B_L_398_19	Tpte. y S.T. (*)	17/9/2019	\$ 72.100.000,00
D.E. 959/19	7/9/2019	B_L_256_19	Tpte. y S.T. (*)	13/6/2019	\$ 91.000.000,00
D.E. 742/18	17/7/2018	B_L_099_18	Tpte. y S.T. (*)	23/7/2018	\$ 45.407.599,87
D.E. 591/18	17/2/2018	S/N	Tpte. y S.T. (*)	15/2/2018	\$ 3.992.710,61
D.E. 205/17	31/1/2017	S/N	Tpte. y S.T. (*)	23/2/2017	\$ 51.520.762,82
D.E. 083/16	22/9/2016	S/N	Tpte. y S.T. (*)	13/10/2016	\$ 38.104.486,46
S/N	7/4/2016	S/N	Tpte. y S.T. (*)	14/4/2016	\$ 47.204.350,50
D.P.E. 518/15	??/12/2015	S/N	Tpte. y S.T. (*)	6/1/2016	\$ 6.706.195,88
D.P.E. 654/15	2/11/2015	S/N	Tpte. y S.T. (*)	11/11/2015	\$ 7.863.342,94
D.P.E. 411/15	1/7/2015	S/N	Tpte. y S.T. (*)	10/7/2015	\$ 11.815.544,87
D.P.E. 358/15	6/4/2015	S/N	EDEN S.A.	14/4/2015	\$ 10.938.851,98
D.P.E. 286/14	/12/14	S/N	EDEN S.A.	16/12/2014	\$ 2.381.498,25
D.P.E. 132/14	17/7/2014	S/N	EDEN S.A.	12/8/2014	\$ 10.084.998,69
D.P.E. 054/14	28/4/2014	S/N	EDEN S.A.	29/4/2014	\$ 5.009.900,39
D.P.E. 632/13	29/11/2013	S/N	EDEN S.A.	10/12/2013	\$ 2.518.705,16
Total a la fecha (18/12/2019)					\$ 508.563.529,28

Por Instruir: \$ 36.335.828,51

Relanzamiento: \$ 243.548.948,42

Etapas Previas: \$ 243.548.948,42

INFORME DE AVANCE A NOVIEMBRE 2019

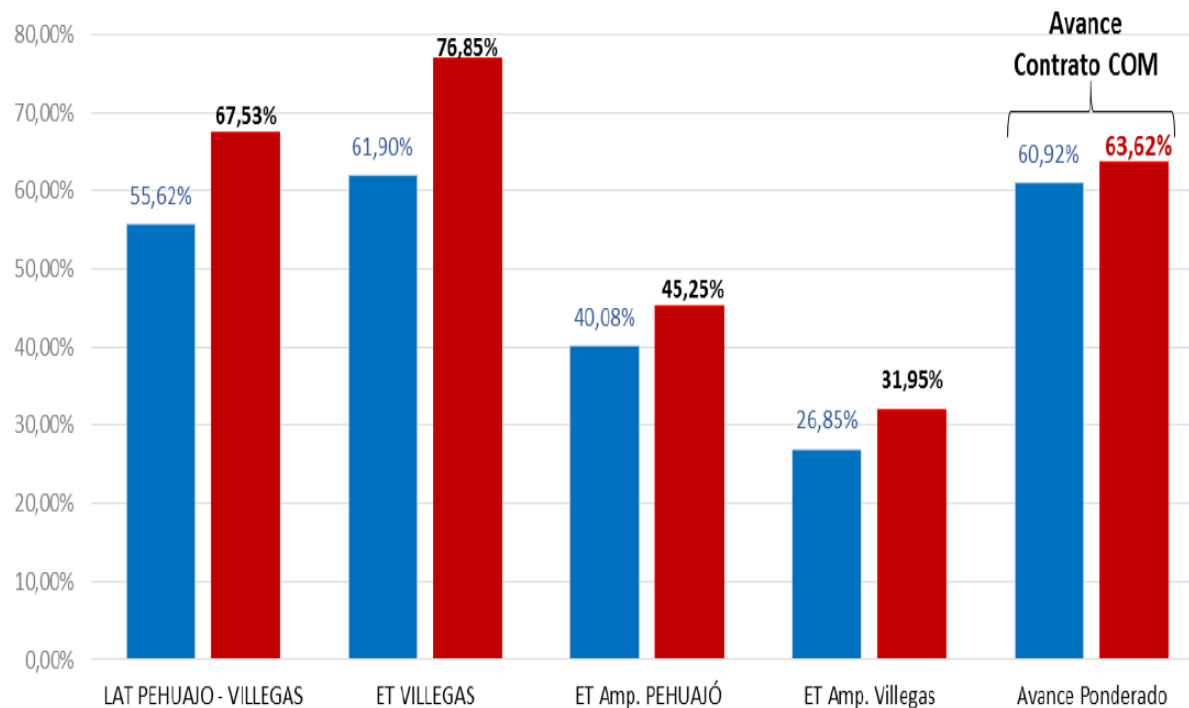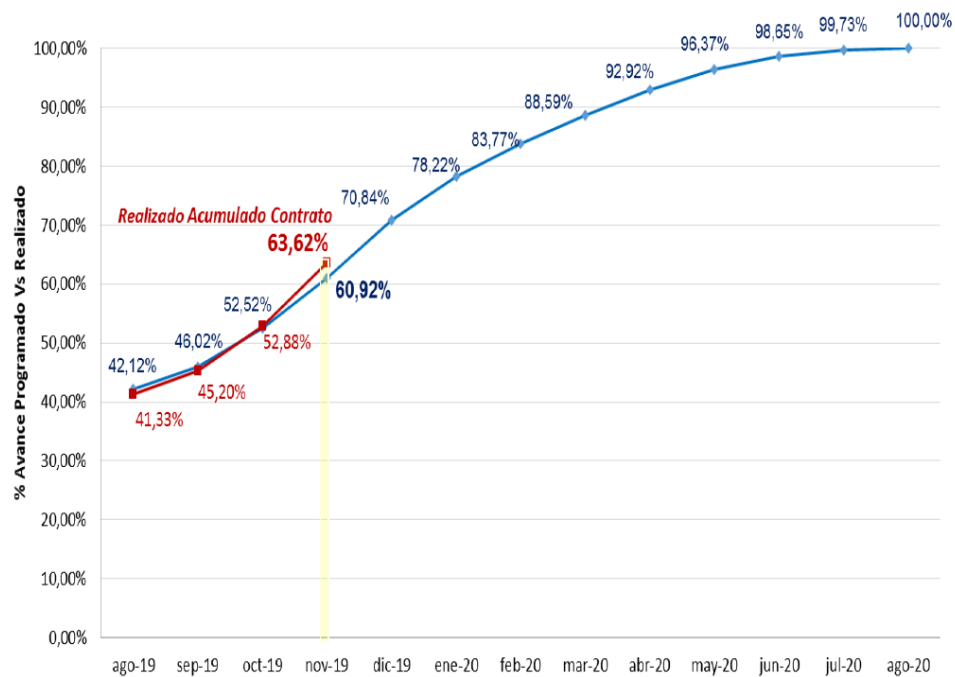













Muchas gracias!

