



REGIÓN ATLÁNTICA

758 MM\$ invertidos en 2019

Obra:	Ampliación Estación Transformadora San Cayetano 33/13,2 kV.				
	Instalacion de un segundo Transformador 33/13,2 kV 5 MVA mas obras de adecuacion.				

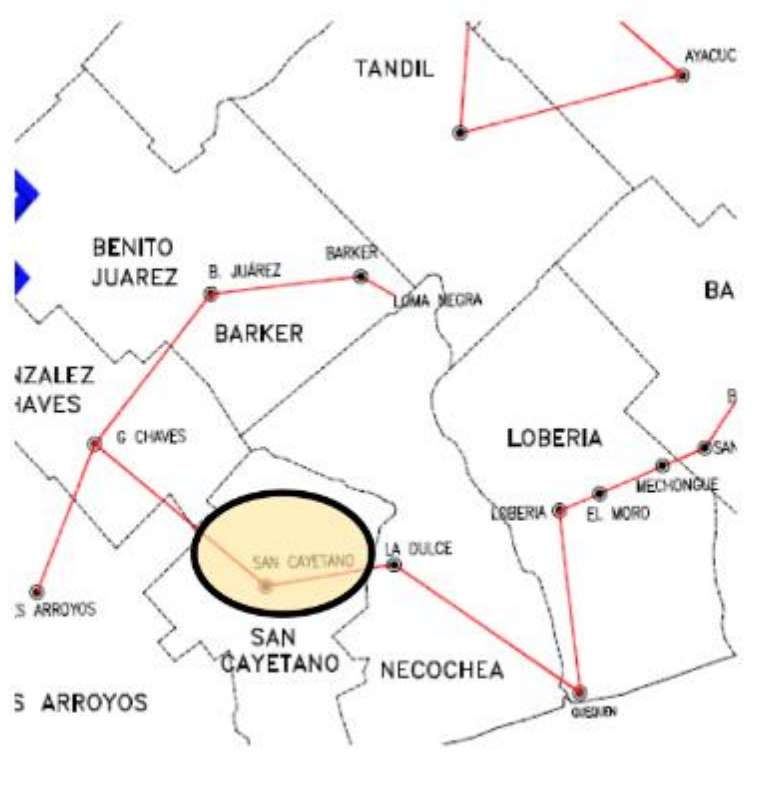


Estado				
Estudios	Pliegos	Licitación	Obra	Finalizado
				X
Instalacion:			Sub-Transmision	
Potencia a instalar:			5	
Km de red a Instalar:			0,0	
Monto de obra Certificado 2019:			\$ -	
Monto de obra Certificado Total:			\$ 5.446.592,00	
Avance Fisico:			100%	
Localidad Beneficiada:			San Cayetano	
Habitantes:			8400	



Obra:

Ampliación Estación Transformadora Lezama 33/13,2 kV



Reemplazo de dos transformadores 33/13,2 kV por otros dos de 5/6,5 MVA

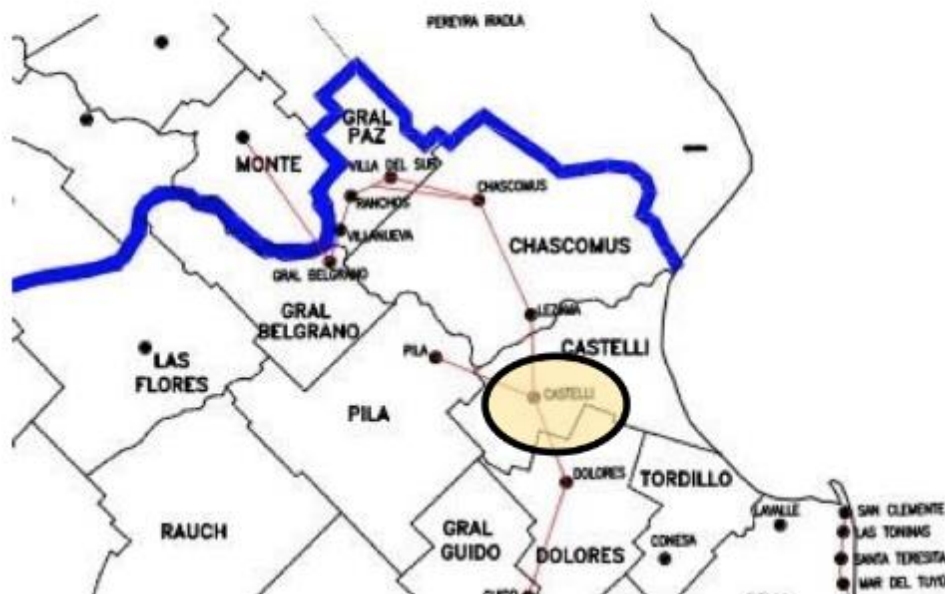

Estado				
Estudios	Piegos	Licitación	Obra	Finalizado
			X	
Instalacion:			Sub-Transmision	
Potencia a instalar:			13	
Km de red a Instalar:			0,0	
Monto de obra Certificado 2019:			\$ 2.108.626,50	
Monto de obra Certificado Total:			\$ 3.484.778,78	
Avance Fisico:			85%	
Localidad Beneficiada:		Lezama		
Habitantes:			5661	




Resta mover TR a la batea definitiva y armar ducto para el cableado de las protecciones y comandos del TR

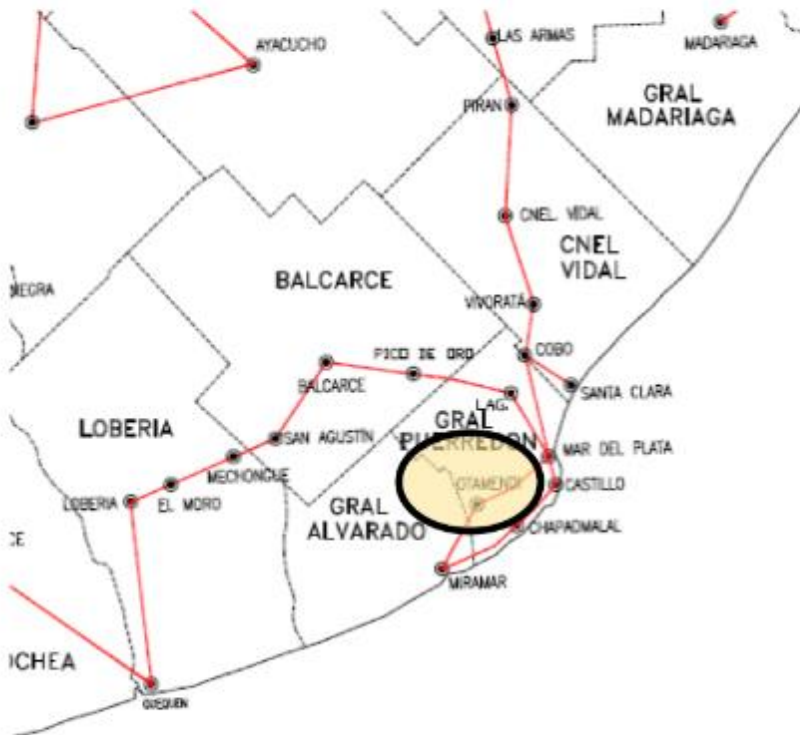	Ampliación Estación Transformadora 33/13,2 kV Otamendi																																																											
Obra:	Reemplazo de dos transformadores 33/13,2 kV 2,5 MVA por otros de 5/6 MVA mas el reemplazo del tablero de 13,2 kV																																																											
																																																												
<table><tr><th colspan="5">Estado</th></tr><tr><th>Estudios</th><th>Piegos</th><th>Licitación</th><th>Obra</th><th>Finalizado</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td colspan="3">Instalacion:</td><td colspan="2">Sub-Transmision</td></tr><tr><td colspan="3">Potencia a instalar:</td><td colspan="2">6,5</td></tr><tr><td colspan="3">Km de red a Instalar:</td><td colspan="2">0,0</td></tr><tr><td colspan="3">Monto de obra Certificado 2019:</td><td colspan="2">\$ 9.260.757,00</td></tr><tr><td colspan="3">Monto de obra Certificado Total:</td><td colspan="2">\$ 10.403.797,40</td></tr><tr><td colspan="3">Avance Fisico:</td><td colspan="2">100%</td></tr><tr><td colspan="3">Localidad Beneficiada:</td><td colspan="2">Otamendi</td></tr><tr><td colspan="3">Habitantes:</td><td colspan="2">6623</td></tr></table>						Estado					Estudios	Piegos	Licitación	Obra	Finalizado					X	Instalacion:			Sub-Transmision		Potencia a instalar:			6,5		Km de red a Instalar:			0,0		Monto de obra Certificado 2019:			\$ 9.260.757,00		Monto de obra Certificado Total:			\$ 10.403.797,40		Avance Fisico:			100%		Localidad Beneficiada:			Otamendi		Habitantes:			6623	
Estado																																																												
Estudios	Piegos	Licitación	Obra	Finalizado																																																								
				X																																																								
Instalacion:			Sub-Transmision																																																									
Potencia a instalar:			6,5																																																									
Km de red a Instalar:			0,0																																																									
Monto de obra Certificado 2019:			\$ 9.260.757,00																																																									
Monto de obra Certificado Total:			\$ 10.403.797,40																																																									
Avance Fisico:			100%																																																									
Localidad Beneficiada:			Otamendi																																																									
Habitantes:			6623																																																									
																																																												

Obra:

Ampliación Estación Transformadora Castelli 33/13,2 kV

Ampliación ET Castelli 33/13,2 kV. Reemplazo de dos transformadores 33/13,2 kV 2,5 MVA por otros dos de 5 MVA (No incluye transformadores)

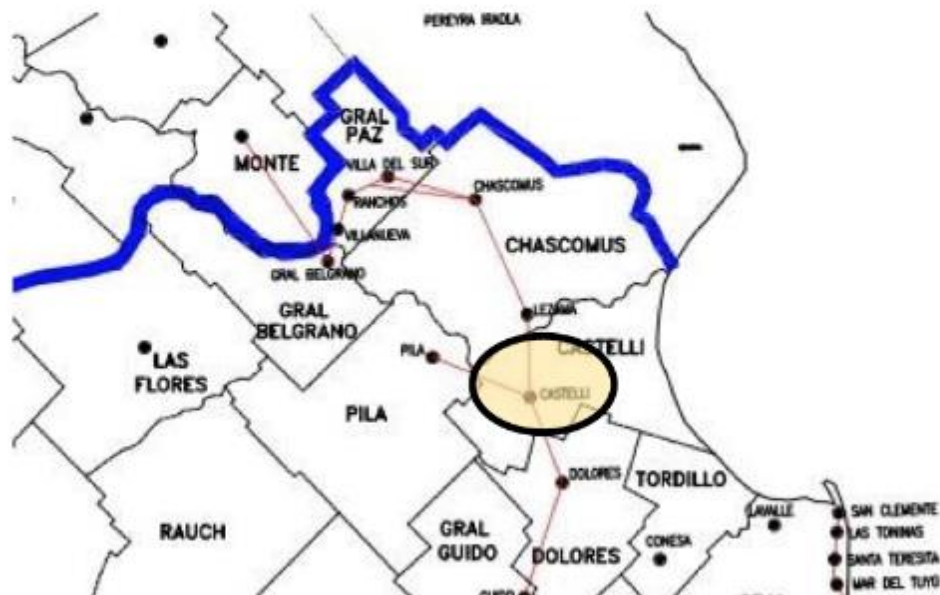


Estado				
Estudios	Pliegos	Licitación	Obra	Finalizado
				X
Instalación:			Sub-Transmision	
Potencia a instalar:			5	
Km de red a instalar:			0,0	
Monto de obra Certificado 2019:			\$ 636.471,00	
Monto de obra Certificado Total:			\$ 5.109.308,92	
Avance Físico:			100%	
Localidad Beneficiada:			Castelli	
Habitantes:			6859	



Obra:

Nueva Estacion Transformadora 132/33/13,2 kV Parque Industrial Mar del Plata y vinculación en 132 kV

Nueva Estacion Transformadora 132/33/13,2 kV Parque Industrial Mar del Plata y vinculación en 132 kV a traves de 5,5 kM de doble terna.

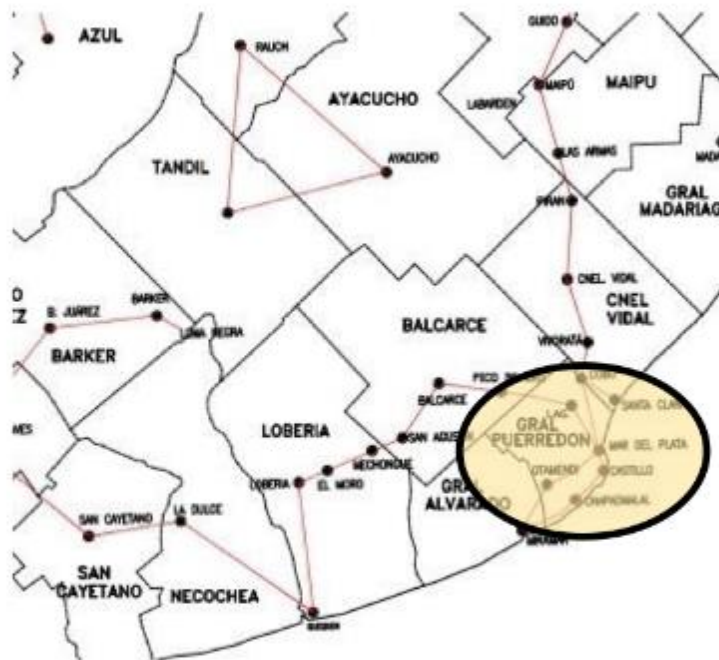

Estado				
Estudios	Piegos	Licitación	Obra	Finalizado
			X	
Instalacion:			Transmisión	
Potencia a instalar:			60	
Km de red a Instalar:			5,5	
Monto de obra Certificado 2019:			\$ 223.040.729,70	
Monto de obra Certificado Total:			\$ 351.465.346,52	
Avance Fisico:			72%	
Localidad Beneficiada:			Mar del Plata	
Habitantes:			860000	




Resta armado de pórticos y la vinculación de 132 kv.

Obra:

Vinculación en 132 kV entre ET Norte y ET Ruta 2 Mar del Plata

Construcción de nuevo vínculo 132 kV en doble terna de 19 km de longitud (5 km subterráneo y 14 km aéreo) entre las EETT Norte y Ruta 2, más la instalación de sistema de celdas GIS de 132 kV en ET Ruta 2.

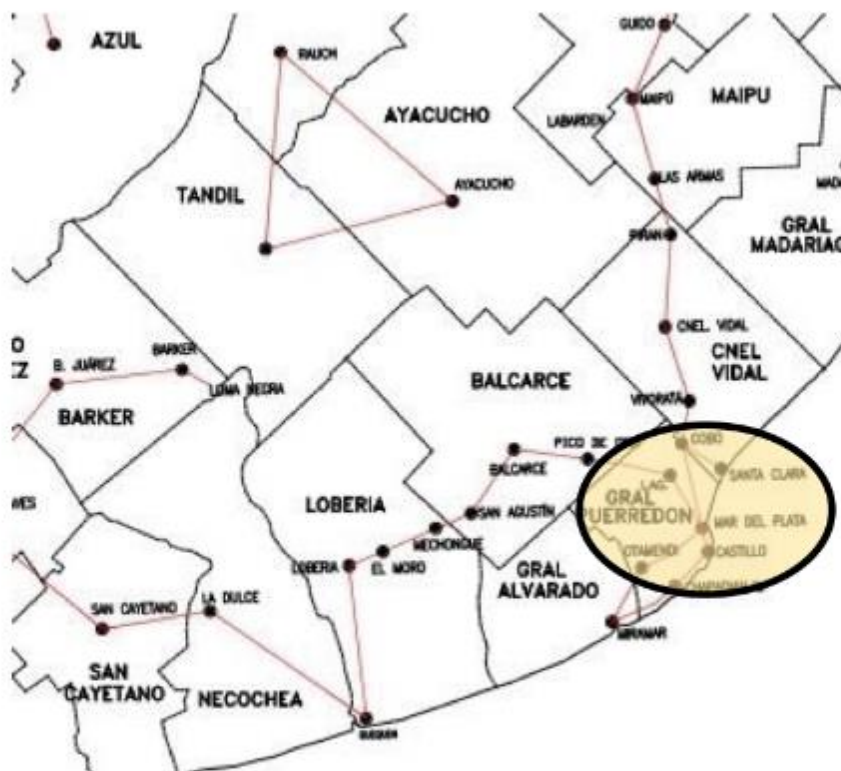

Estado				
Estudios	Pliegos	Licitación	Obra	Finalizado
		X		
Instalación:			Transmisión	
Potencia a instalar:			0	
Km de red a instalar:			19,0	
Monto de obra Certificado 2019:			\$ 231.063.438,29	
Monto de obra Certificado Total:			\$ 231.063.438,29	
Avance Físico:			40%	
Localidad Beneficiada:			Mar del Plata	
Habitantes:			860000	


Salidas de línea: Terminada Bahía GIS.
Tendido subterráneo: Instalando caños para el posterior tendido de CASAT.
Línea Aérea: Adjudicada.



Obra:

Nueva Estacion Transformadora 132/33/13,2 kV Ayacucho y vinculación en 132 kV

Nueva Estacion Transformadora 132/33/13,2 kV Ayacucho y vinculación en 132 kV a traves de 3 km de LAT

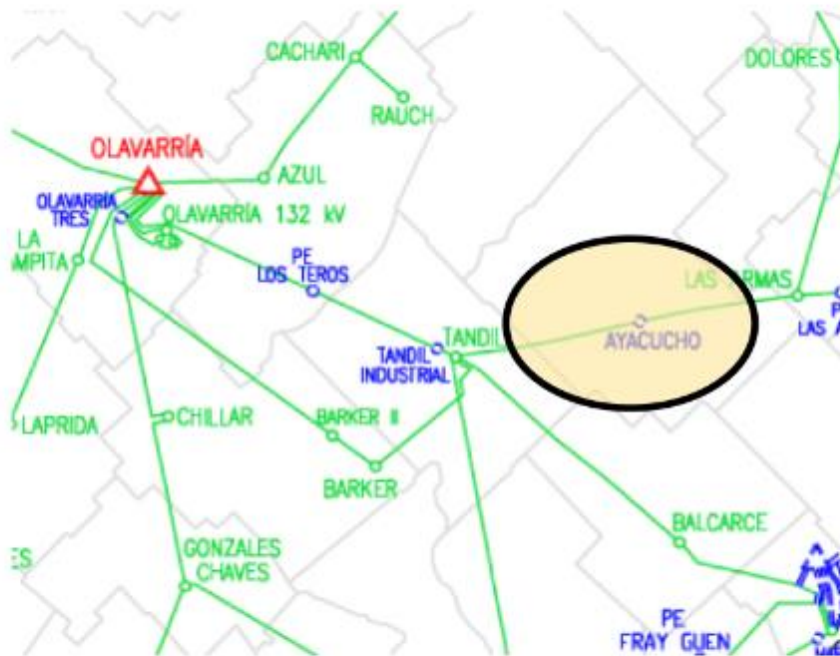


Estado				
Estudios	Piegos	Licitación	Obra	Finalizado
			X	
Instalacion:			Transmisión	
Potencia a instalar:			60	
Km de red a Instalar:			3,0	
Monto de obra Certificado 2019:			\$ 234.463.944,83	
Monto de obra Certificado Total:			\$ 234.463.944,83	
Avance Fisico:			0%	
Localidad Beneficiada:		Ayacucho / Rauch		
Habitantes:			32409	

Se adquirieron los transformadores y se adjudicó la vinculación aérea entre la ET y la LAT Tandil – Las Armas.

Obra:

Nueva Estación Transformadora Tandil Industrial 2x30/20/30 MVA132/33/13,2 kV

Nueva Estación Transformadora Tandil Industrial 2x30/20/30 MVA132/33/13,2 kV mas la vinculacion de 0,45 km de LAT 132 kV DT y la apertura de la LAT existente Tandil - Olavarria

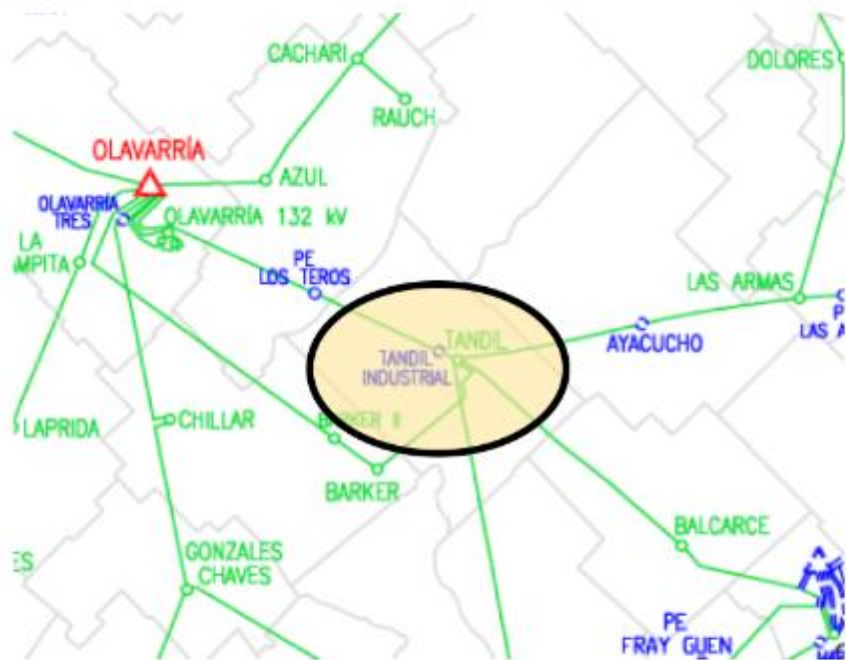

Estado				
Estudios	Pliegos	Licitación	Obra	Finalizado
			X	
Instalacion:			Transmisión	
Potencia a instalar:			60	
Km de red a Instalar:			0,4	
Monto de obra Certificado 2019:			\$ 45.150.080,27	
Monto de obra Certificado Total:			\$ 129.173.332,86	
Avance Fisico:			60%	
Localidad Beneficiada:		Tandil / Ayacucho / Rauch		
Habitantes:			149326	

1era etapa – Obra civil culminada.

2da etapa en curso: Aparatos (seccionadores, interruptores, TI, TV, descargadores montados), transformador instalado en la base, se está procediendo al armado. Se empezó con la construcción de la vinculación de la ET a la red 132 kV.


Restará como tercera etapa sistema de comunicación y SCADA.



Obra:

Ampliacion ET Mar de Ajo 132/33/13,2 kV


Ampliación ET MAR DE AJÓ (1era. Etapa): Contempla el reemplazo del transformador T2MJ 132/33/13,2 kV de 15/10/15 MVA por una máquina de 30/10/30 MVA

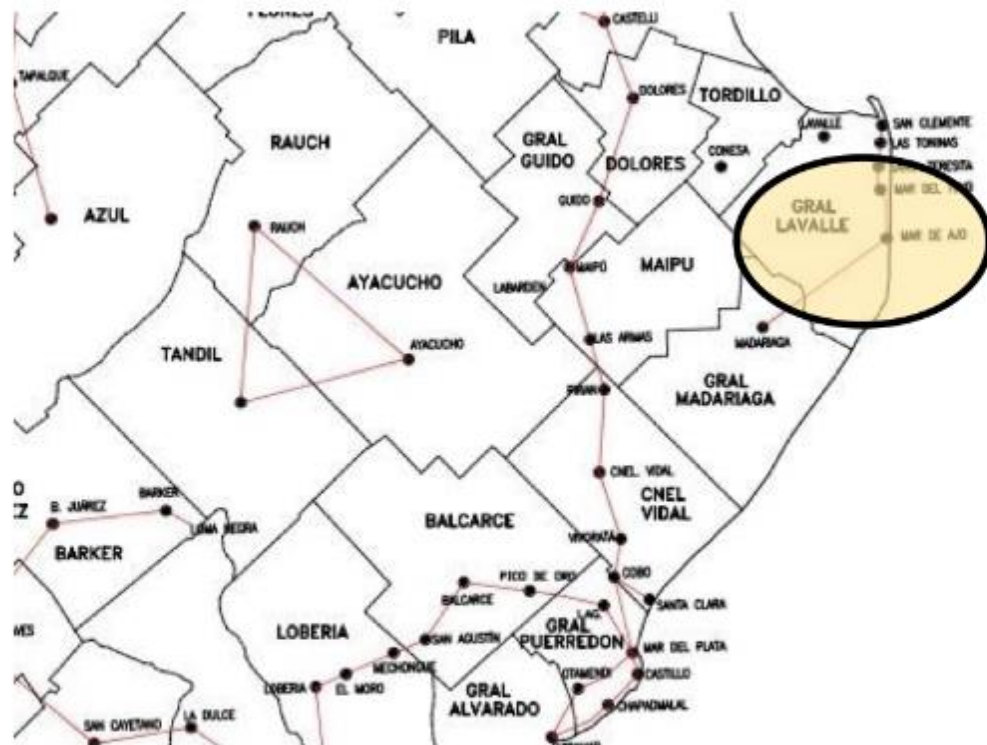

Estado				
Estudios	Pliegos	Licitación	Obra	Finalizado
			X	
Instalacion:			Transmisión	
Potencia a instalar:			30	
Km de red a Instalar:			0,0	
Monto de obra Certificado 2019:			\$ 4.022.948,49	
Monto de obra Certificado Total:			\$ 4.022.948,49	
Avance Fisico:			100%	
Localidad Beneficiada:		Mar de Ajo / San Bernardo		
Habitantes:			21892	


Transformador reemplazado. Resta cambiar tren de celdas (a cargo de TRANSBA) y aparatos relacionados al campo del TR.

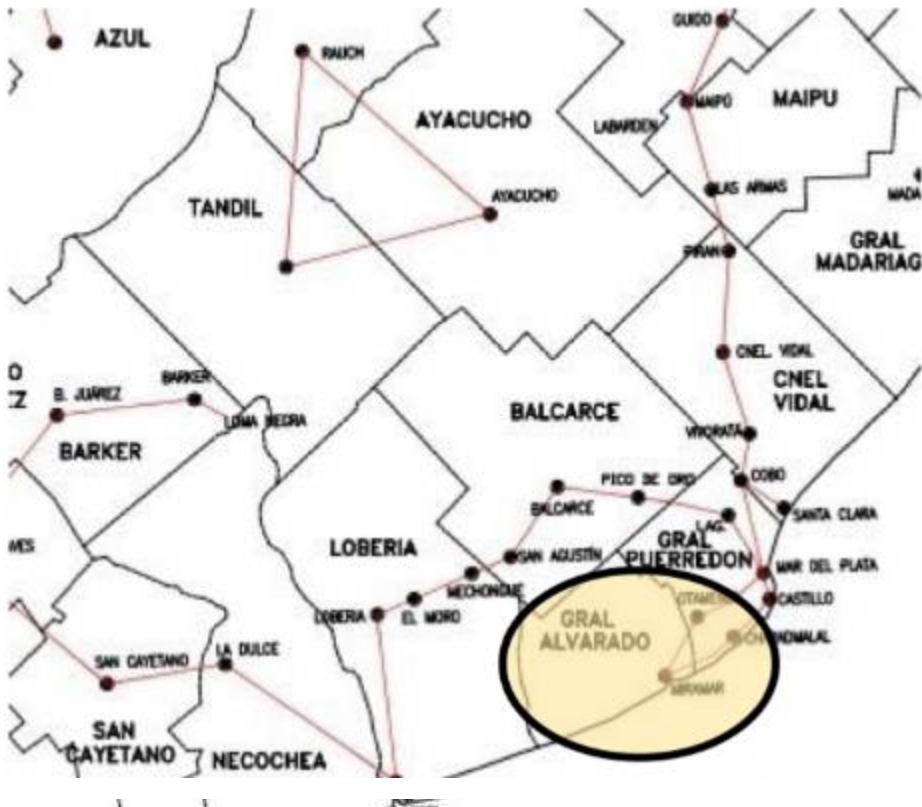

	Ampliacion ET Miramar 132/33/13,2 kV																																																											
Obra:	Ampliación ET MIRAMAR (1era. Etapa): Contempla el reemplazo del transformador T1MR 132/33/13,2 kV de 15/10/15 MVA por una máquina de 30/20/30 MVA																																																											
																																																												
<table><tr><th colspan="5">Estado</th></tr><tr><th>Estudios</th><th>Pliegos</th><th>Licitación</th><th>Obra</th><th>Finalizado</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Instalacion:</td><td colspan="2">Transmisión</td></tr><tr><td colspan="3">Potencia a instalar:</td><td colspan="2">30</td></tr><tr><td colspan="3">Km de red a Instalar:</td><td colspan="2">0,0</td></tr><tr><td colspan="3">Monto de obra Certificado 2019:</td><td colspan="2">\$ 7.139.603,70</td></tr><tr><td colspan="3">Monto de obra Certificado Total:</td><td colspan="2">\$ 7.139.603,70</td></tr><tr><td colspan="3">Avance Fisico:</td><td colspan="2">50%</td></tr><tr><td colspan="3">Localidad Beneficiada:</td><td colspan="2">Miramar</td></tr><tr><td colspan="3">Habitantes:</td><td colspan="2">29433</td></tr></table>						Estado					Estudios	Pliegos	Licitación	Obra	Finalizado				X		Instalacion:			Transmisión		Potencia a instalar:			30		Km de red a Instalar:			0,0		Monto de obra Certificado 2019:			\$ 7.139.603,70		Monto de obra Certificado Total:			\$ 7.139.603,70		Avance Fisico:			50%		Localidad Beneficiada:			Miramar		Habitantes:			29433	
Estado																																																												
Estudios	Pliegos	Licitación	Obra	Finalizado																																																								
			X																																																									
Instalacion:			Transmisión																																																									
Potencia a instalar:			30																																																									
Km de red a Instalar:			0,0																																																									
Monto de obra Certificado 2019:			\$ 7.139.603,70																																																									
Monto de obra Certificado Total:			\$ 7.139.603,70																																																									
Avance Fisico:			50%																																																									
Localidad Beneficiada:			Miramar																																																									
Habitantes:			29433																																																									
Transformador reemplazado. Resta el reemplazo del equipamiento correspondiente a los campos de transformación.																																																												

Canon Ampliaciones Res. SE 01/03 - Ampliacion ET Olavarria

<u>Obra:</u>	Ampliación ET 500/132 kV -Instalación de Transformador 500/132 kV de Reserva e instalaciones complementarias -Obra determinada por Resolución N° 1/2003. Iniciado período de amortización en noviembre 2015, CAMMESA factura a los distribuidores declarados beneficiarios con valor presente y proyección
---------------------	--

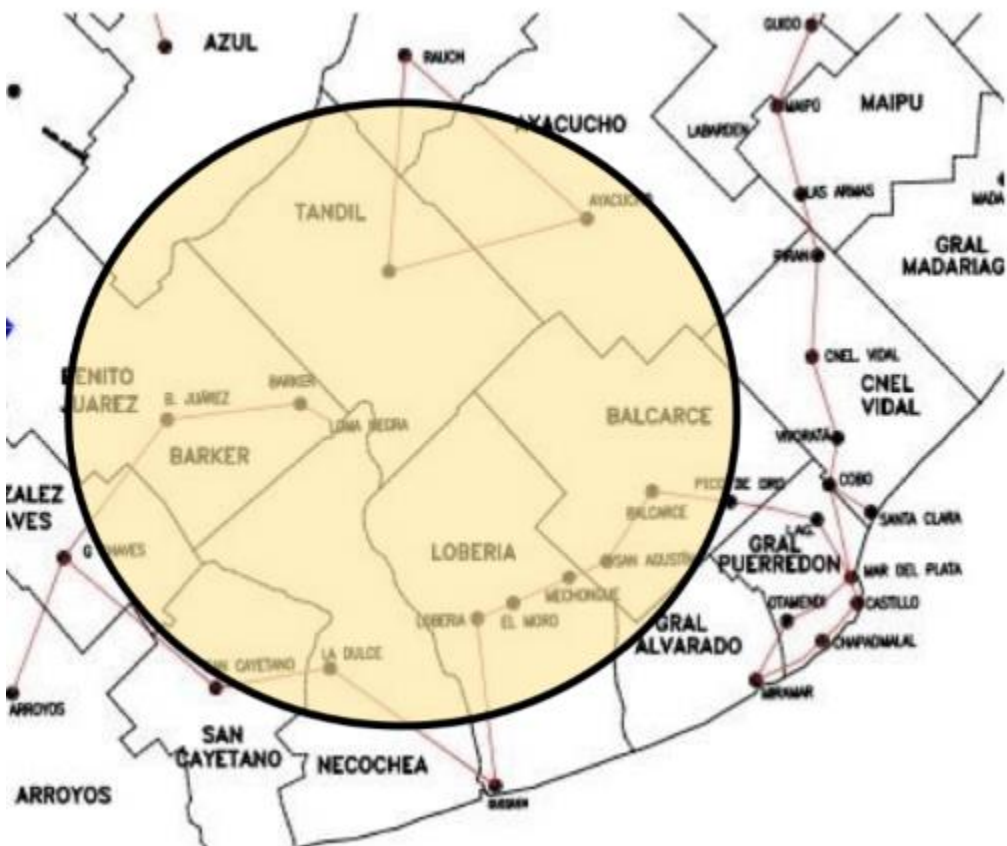


Estado				
Estudios	Pliegos	Licitación	Obra	Finalizado
				X
Instalacion:			Transmisión	
Potencia a instalar:			0	
Km de red a Instalar:			0,0	
Monto de obra Certificado 2019:			\$ 60.363,78	
Monto de obra Certificado Total:			\$ 818.733,00	
Avance Fisico:			33%	
Localidad Beneficiada:		Centro de la Provincia de Buenos Aires		
Habitantes:			300000	

Obra:

Ampliación ET Quequén 132/33/13,2 kV

Repotenciación ET Quequén (TRANSBA S.A.) mediante la abertura de la LAT 132 kV Necochea - Mar del Plata, construcción de un nuevo campo de entrada de 132 kV, un nuevo campo de transformación 132/33/13,2 kV, un campo de barras de transferencia longitudinal en 132 kV entre el campo existente y el nuevo, la incorporación en una primera etapa de un transformador 132/33/13,2 kV - 30/20/30 MVA y ampliación del tren de celdas de 33 y 13,2 kV; en una segunda etapa, cambio del transformador existente de 15/10/15 MVA por otro de 30/20/30 MVA, adecuación de elementos de campo y celdas acordes a nuevas potencias de los transformadores a instalar y adecuación de sistema de telecontrol y protecciones.

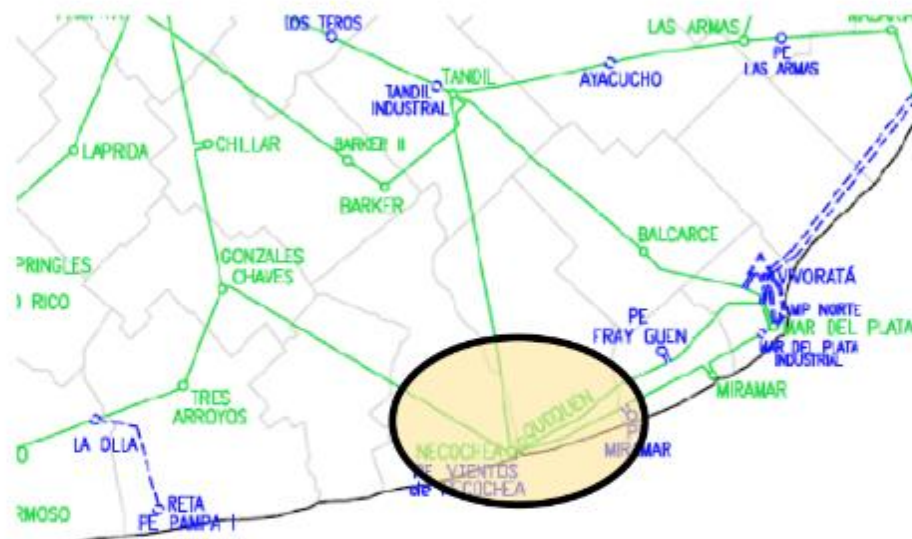


Estado				
Estudios	Pliegos	Licitación	Obra	Finalizado
	X			
Instalacion:			Transmisión	
Potencia a instalar:			60	
Km de red a Instalar:			0,0	
Monto de obra Certificado 2019:			\$ -	
Monto de obra Certificado Total:			\$ -	
Avance Fisico:			0%	
Localidad Beneficiada:		Necochea-Quequen		
Habitantes:			92933	

OBRA A EJECUTARSE POR DEBA CON FONDOS CAF.
Se realizaron Estudios y Pliegos.

Obra:

Ampliación ET Chascomus 132/33/13,2 kV

Ampliacion ET Chascomús 132/33/13,2 kV

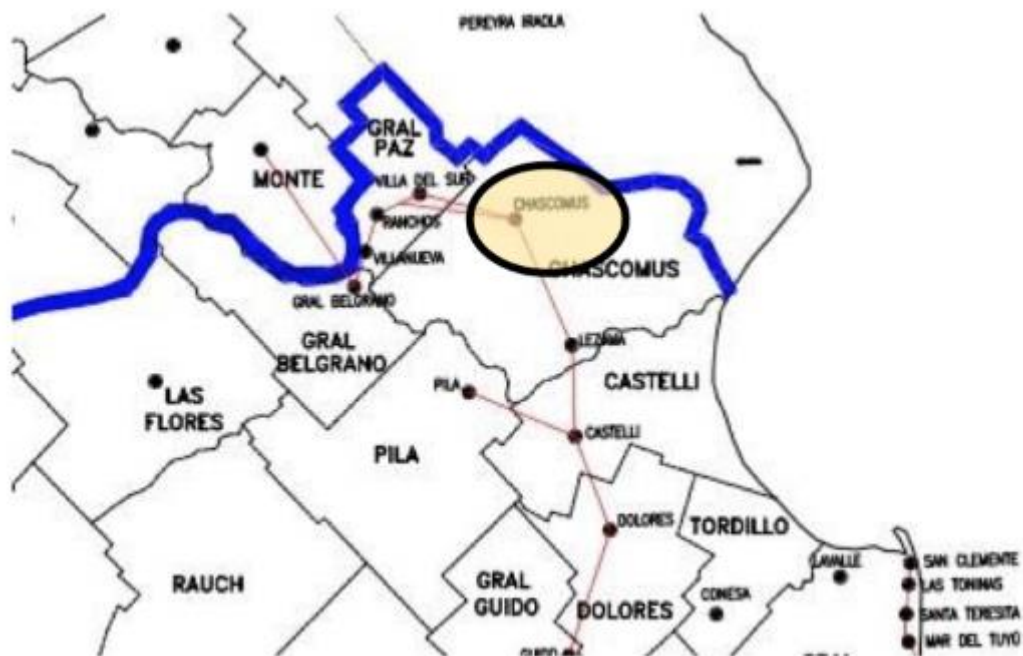

Transformador adquirido.
Se reemplazaron TI de MT.

Estado				
Estudios	Piegos	Licitación	Obra	Finalizado
		X		
Instalacion:			Transmisión	
Potencia a instalar:			0	
Km de red a Instalar:			0,0	
Monto de obra Certificado 2019:			\$ 692.074,10	
Monto de obra Certificado Total:			\$ 5.255.010,70	
Avance Fisico:			0%	
Localidad Beneficiada:		Chascomus - V del Sur - Ranchos - Villa Nueva - G Belgrano - Lezama - Castelli - Pila		
Habitantes:			76000	


REGIÓN NORTE

408 MM\$ invertidos en 2019

Obra:

LAMT 33 kV Mari Lauquen - Pellegrini y ampliación ET 33/13,2 kV Pellegrini (campo entrada nueva LAMT 33 kV)

Ejecucion de primera ETAPA la cual es LAMT 33 kV Mari Lauquen - Pellegrini y ampliación ET 33/13,2 kV Pellegrini (campo entrada nueva LAMT 33 kV)

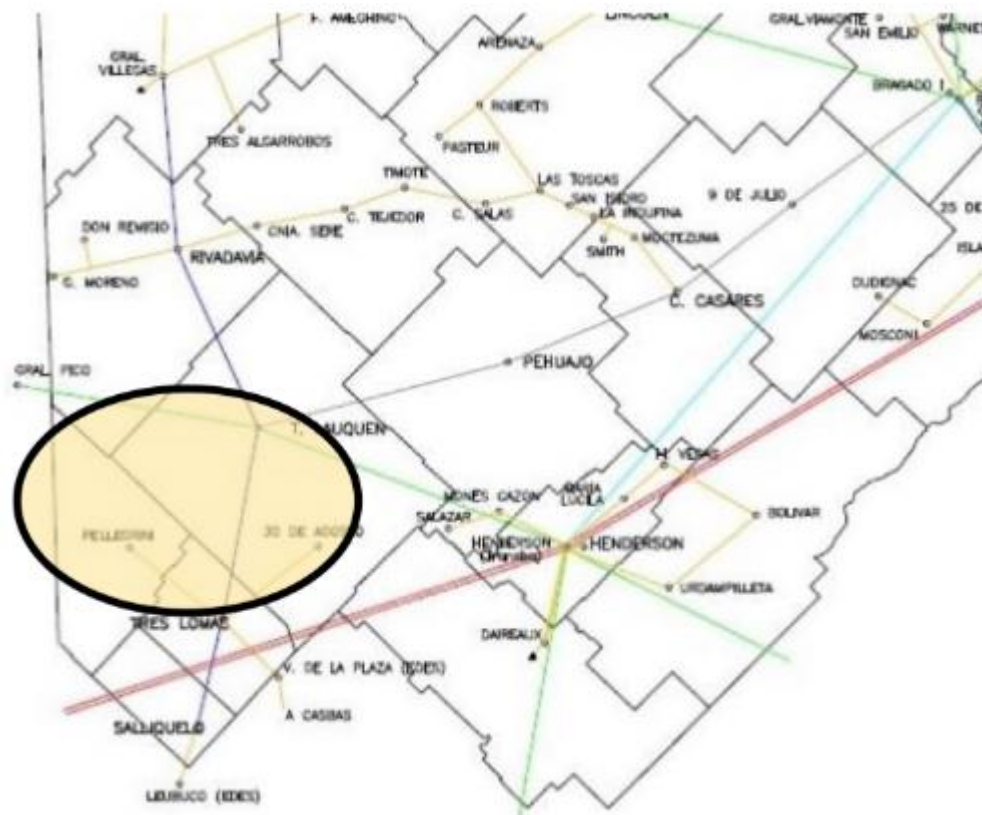

Estado				
Estudios	Pliegos	Licitación	Obra	Finalizado
			X	
Instalacion:			Sub-Transmision	
Potencia a instalar:			0	
Km de red a Instalar:			50,0	
Monto de obra Certificado 2019:			\$ 32.067.623,19	
Monto de obra Certificado Total:			\$ 51.176.604,75	
Avance Fisico:			60%	
Localidad Beneficiada:		Mary Lauquen - Pellegrini		
Habitantes:			5215	



Se está realizando el parado de estructuras.

Obra:

Ampliación Estacion Transformadora Gorrasi33/13,2 kV.




Ampliación Estacion Transformadora Gorrasi33/13,2 kV. Instalacion de un TR 33/13,2 kV 1,6MVA en reemplazo de uno de 500 KVA



Estado				
Estudios	Pliegos	Licitación	Obra	Finalizado
			X	
Instalacion:			Sub-Transmision	
Potencia a instalar:			1,6	
Km de red a Instalar:			0,0	
Monto de obra Certificado 2019:			\$ 10.125.530,50	
Monto de obra Certificado Total:			\$ 10.687.498,28	
Avance Fisico:			99%	
Localidad Beneficiada:		Gorrasi		
Habitantes:			2500	



Resta cableado de protecciones y pruebas.

Obra:	Ampliación ET 33/13,2 kV Villa Gral. Savio																																																											
	Ampliación ET Villa Gral. Savio, instalando dos transf. 33/13,2 kV -630 kVA c/u, retirando el de 500 kVA existente																																																											
			<table><tr><th colspan="5">Estado</th></tr><tr><th>Estudios</th><th>Pliegos</th><th>Licitación</th><th>Obra</th><th>Finalizado</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td colspan="3">Instalacion:</td><td colspan="2">Sub-Transmision</td></tr><tr><td colspan="3">Potencia a instalar:</td><td colspan="2">1,6</td></tr><tr><td colspan="3">Km de red a Instalar:</td><td colspan="2">0,0</td></tr><tr><td colspan="3">Monto de obra Certificado 2019:</td><td>\$</td><td>1.164.138,00</td></tr><tr><td colspan="3">Monto de obra Certificado Total:</td><td>\$</td><td>1.714.011,86</td></tr><tr><td colspan="3">Avance Fisico:</td><td colspan="2">100%</td></tr><tr><td colspan="2">Localidad Beneficiada:</td><td colspan="3">General Savio</td></tr><tr><td colspan="3">Habitantes:</td><td colspan="2">1511</td></tr></table>			Estado					Estudios	Pliegos	Licitación	Obra	Finalizado					X	Instalacion:			Sub-Transmision		Potencia a instalar:			1,6		Km de red a Instalar:			0,0		Monto de obra Certificado 2019:			\$	1.164.138,00	Monto de obra Certificado Total:			\$	1.714.011,86	Avance Fisico:			100%		Localidad Beneficiada:		General Savio			Habitantes:			1511	
			Estado																																																									
Estudios	Pliegos	Licitación	Obra	Finalizado																																																								
				X																																																								
Instalacion:			Sub-Transmision																																																									
Potencia a instalar:			1,6																																																									
Km de red a Instalar:			0,0																																																									
Monto de obra Certificado 2019:			\$	1.164.138,00																																																								
Monto de obra Certificado Total:			\$	1.714.011,86																																																								
Avance Fisico:			100%																																																									
Localidad Beneficiada:		General Savio																																																										
Habitantes:			1511																																																									
			 																																																									

Obra:

Ampliación ET 33/13,2 kV PASA

Ampliación Estacion Transformadora Pasa 33/13,2 kV. Instalacion de un TR 33/13,2 kV 7,5MVA.



Estado				
Estudios	Pliegos	Licitación	Obra	Finalizado
			X	
Instalacion:			Sub-Transmision	
Potencia a instalar:			7,5	
Km de red a Instalar:			0,0	
Monto de obra Certificado 2019:			\$ 20.739.414,08	
Monto de obra Certificado Total:			\$ 20.794.786,48	
Avance Fisico:			88%	
Localidad Beneficiada:		Campana		
Habitantes:			5000	



Resta cableado de protecciones.

Vinculo doble terna 33 kV Alimentador 5-50 y 4-33 - Campana




Obra:

Vinculo doble terna 33 kV Alimentador 5-50 y 4-33 - Campana




Estado				
Estudios	Pliegos	Licitación	Obra	Finalizado
			X	
Instalacion:			Sub-Transmision	
Potencia a instalar:			0	
Km de red a instalar:			6,0	
Monto de obra Certificado 2019:			\$ 1.800.000,00	
Monto de obra Certificado Total:			\$ 2.105.641,14	
Avance Fisico:			40%	
Localidad Beneficiada:		Campana		
Habitantes:			7500	

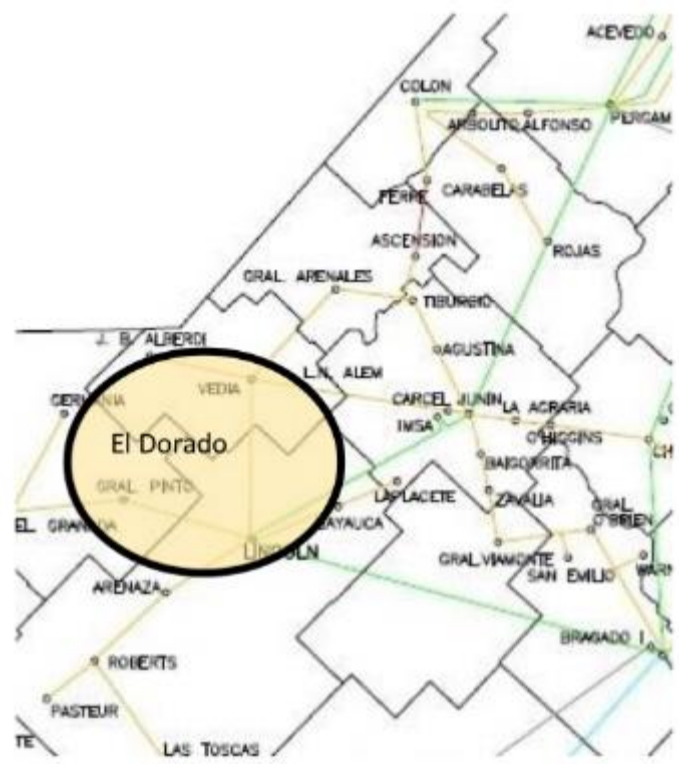
Vialidad aún no otorgaba el permiso para continuar la obra.
La obra se reactivó.

Nueva ET 33/13,2 kV El Dorado																																																											
Obra:	Ampliación ET 33/13,2 kV El Dorado, instalando el 2º transformador de 1000 kVA, incluyendo instalaciones complementarias, CAS de 13,2 kV y 2 juegos de 3 seccionadores unipolares a cuchilla de 15 kV																																																										
<div></div>																																																											
<table><tr><th colspan="5">Estado</th></tr><tr><th>Estudios</th><th>Pliegos</th><th>Licitación</th><th>Obra</th><th>Finalizado</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Instalacion:</td><td colspan="2">Sub-Transmision</td></tr><tr><td colspan="3">Potencia a instalar:</td><td colspan="2">1</td></tr><tr><td colspan="3">Km de red a Instalar:</td><td colspan="2">0,0</td></tr><tr><td colspan="3">Monto de obra Certificado 2019:</td><td colspan="2">\$ -</td></tr><tr><td colspan="3">Monto de obra Certificado Total:</td><td colspan="2">\$ 2.229.955,51</td></tr><tr><td colspan="3">Avance Fisico:</td><td colspan="2">58%</td></tr><tr><td colspan="3">Localidad Beneficiada:</td><td colspan="2">El Dorado</td></tr><tr><td colspan="3">Habitantes:</td><td colspan="2">318</td></tr></table>					Estado					Estudios	Pliegos	Licitación	Obra	Finalizado				X		Instalacion:			Sub-Transmision		Potencia a instalar:			1		Km de red a Instalar:			0,0		Monto de obra Certificado 2019:			\$ -		Monto de obra Certificado Total:			\$ 2.229.955,51		Avance Fisico:			58%		Localidad Beneficiada:			El Dorado		Habitantes:			318	
Estado																																																											
Estudios	Pliegos	Licitación	Obra	Finalizado																																																							
			X																																																								
Instalacion:			Sub-Transmision																																																								
Potencia a instalar:			1																																																								
Km de red a Instalar:			0,0																																																								
Monto de obra Certificado 2019:			\$ -																																																								
Monto de obra Certificado Total:			\$ 2.229.955,51																																																								
Avance Fisico:			58%																																																								
Localidad Beneficiada:			El Dorado																																																								
Habitantes:			318																																																								
<div></div>																																																											
Se finalizó el tendido de 5 km de LAMT 13,2 kV.																																																											


Obra:	Instalación de reguladores de tensión 7,62 kV - 100 A en ET Charlone
	Instalación de reguladores de tensión 7,62 kV - 100 A en ET Charlone

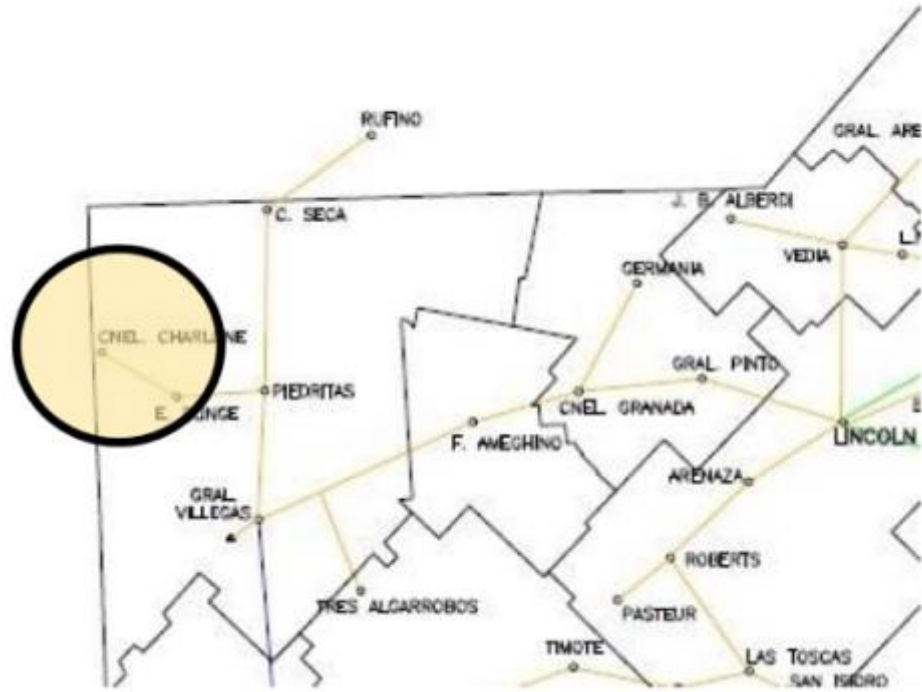


Estado				
Estudios	Piegos	Licitación	Obra	Finalizado
				X
Instalacion:			Sub-Transmision	
Potencia a instalar:			0	
Km de red a Instalar:			0,0	
Monto de obra Certificado 2019:			\$ 63.130,39	
Monto de obra Certificado Total:			\$ 155.312,63	
Avance Fisico:			100%	
Localidad Beneficiada:		Charlone		
Habitantes:			1348	




Obra:	Instalación de reguladores de tensión 7,62 kV - 100 A en ET Bunge				
	Instalación de reguladores de tensión 7,62 kV - 100 A en ET Bunge				

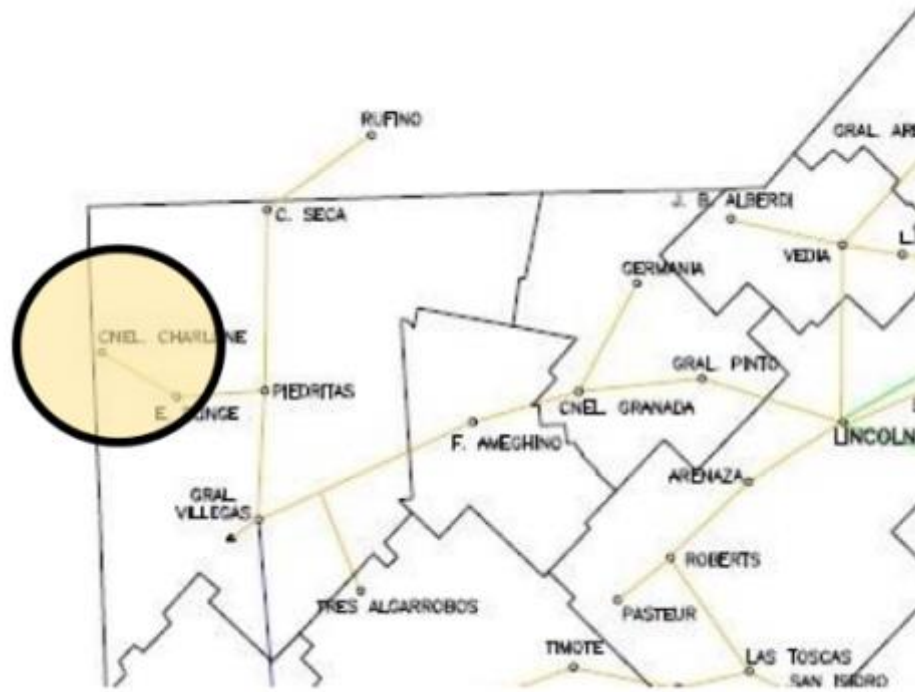


Estado				
Estudios	Pliegos	Licitación	Obra	Finalizado
				X
Instalacion:			Sub-Transmision	
Potencia a instalar:			0	
Km de red a Instalar:			0,0	
Monto de obra Certificado 2019:			\$ 1.466.910,27	
Monto de obra Certificado Total:			\$ 1.466.910,27	
Avance Fisico:			100%	
Localidad Beneficiada:			Bunge	
Habitantes:			2276	





Obra:	Nueva LAMT 33 kV entre ET G Arenales y nueva ET Arribeños
	Nueva LAMT 33 kV entre ET G Arenales y nueva ET Arribeños mas Nueva ET Arribeños 33/13,2 kV

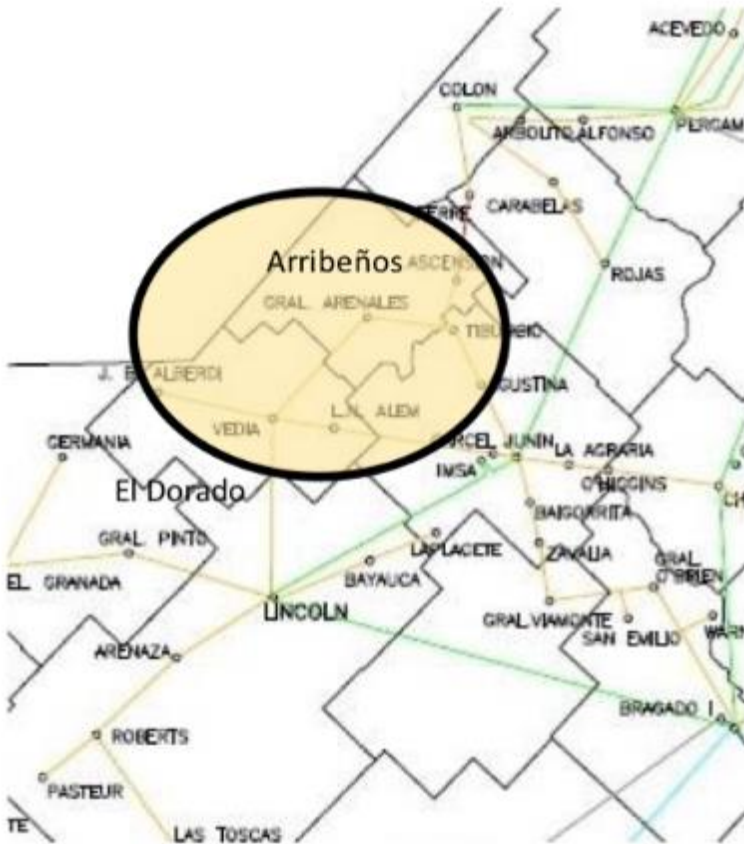

Estado				
Estudios	Pliegos	Licitación	Obra	Finalizado
				X
Instalacion:			Sub-Transmision	
Potencia a instalar:			0	
Km de red a Instalar:			25,0	
Monto de obra Certificado 2019:			\$ 597.698,66	
Monto de obra Certificado Total:			\$ 8.969.557,94	
Avance Fisico:			100%	
Localidad Beneficiada:		Arribeños - G Arenales		
Habitantes:			17813	

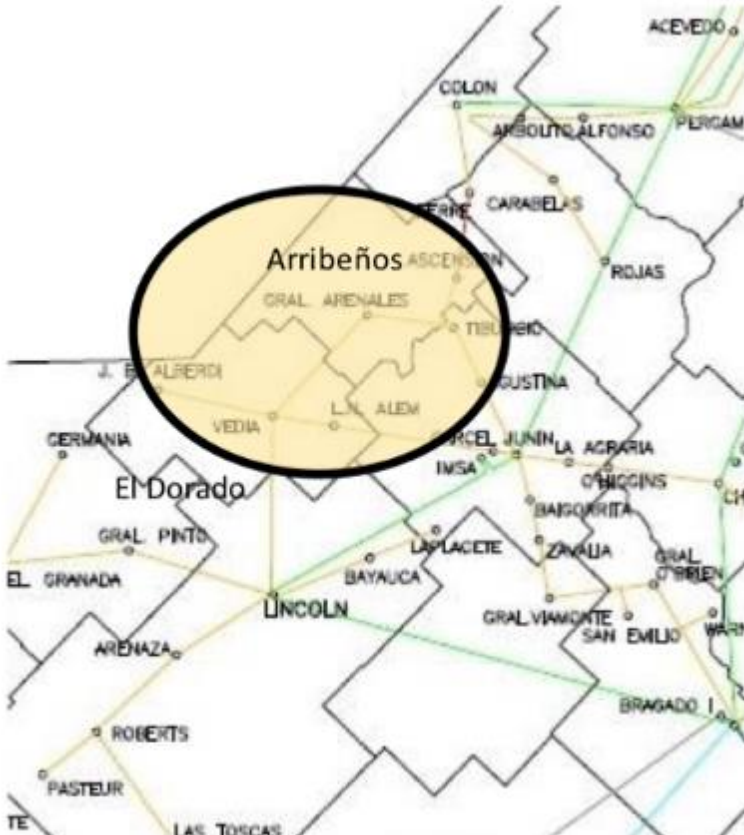


	Nueva ET Arribeños 33/13,2 kV																																																											
Obra:	Nueva LAMT 33 kV entre ET G Arenales y nueva ET Arribeños mas Nueva ET Arribeños 33/13,2 kV																																																											
																																																												
<table><tr><th colspan="5">Estado</th></tr><tr><th>Estudios</th><th>Piegos</th><th>Licitación</th><th>Obra</th><th>Finalizado</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td colspan="3">Instalacion:</td><td colspan="2">Sub-Transmision</td></tr><tr><td colspan="3">Potencia a instalar:</td><td colspan="2">7,5</td></tr><tr><td colspan="3">Km de red a Instalar:</td><td colspan="2">0,0</td></tr><tr><td colspan="3">Monto de obra Certificado 2019:</td><td colspan="2">\$ -</td></tr><tr><td colspan="3">Monto de obra Certificado Total:</td><td colspan="2">\$ 8.536.548,51</td></tr><tr><td colspan="3">Avance Fisico:</td><td colspan="2">100%</td></tr><tr><td colspan="2">Localidad Beneficiada:</td><td colspan="3">Arribeños</td></tr><tr><td colspan="3">Habitantes:</td><td colspan="2">2910</td></tr></table>						Estado					Estudios	Piegos	Licitación	Obra	Finalizado					X	Instalacion:			Sub-Transmision		Potencia a instalar:			7,5		Km de red a Instalar:			0,0		Monto de obra Certificado 2019:			\$ -		Monto de obra Certificado Total:			\$ 8.536.548,51		Avance Fisico:			100%		Localidad Beneficiada:		Arribeños			Habitantes:			2910	
Estado																																																												
Estudios	Piegos	Licitación	Obra	Finalizado																																																								
				X																																																								
Instalacion:			Sub-Transmision																																																									
Potencia a instalar:			7,5																																																									
Km de red a Instalar:			0,0																																																									
Monto de obra Certificado 2019:			\$ -																																																									
Monto de obra Certificado Total:			\$ 8.536.548,51																																																									
Avance Fisico:			100%																																																									
Localidad Beneficiada:		Arribeños																																																										
Habitantes:			2910																																																									
																																																												

Obra:

Nueva LAMT ET Mercedes - ET Navarro doble terna 33 kV

Nueva LAMT ET Mercedes - ET Navarro doble terna 33 kV

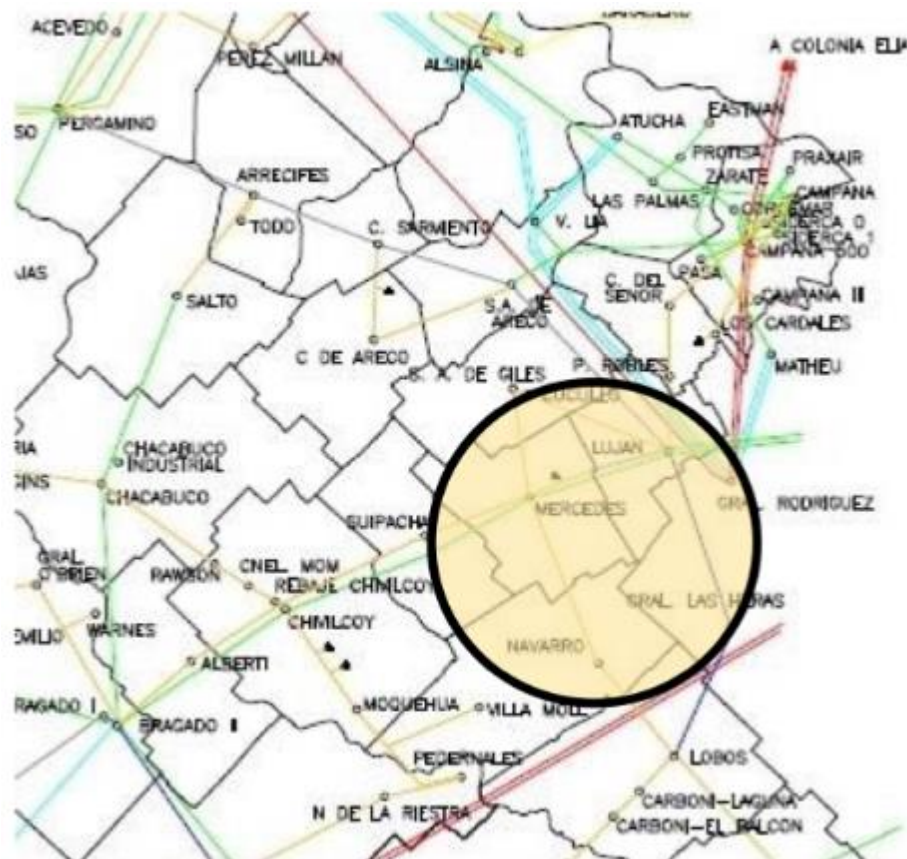


Estado				
Estudios	Pliegos	Licitación	Obra	Finalizado
				X
Instalacion:			Sub-Transmision	
Potencia a instalar:			0	
Km de red a Instalar:			1,5	
Monto de obra Certificado 2019:			\$ 365.146,40	
Monto de obra Certificado Total:			\$ 426.552,40	
Avance Fisico:			100%	
Localidad Beneficiada:		Mercedes-Navarro		
Habitantes:			83338	

Obra:

Ampliación ET Cañada Seca 33/13,2 kV. Provision reconector 13,2 kV Salida Villa Saboya y Santa Regina

Ampliación ET Cañada Seca 33/13,2 kV. Provision reconector 13,2 kV Salida Villa Saboya y Santa Regina

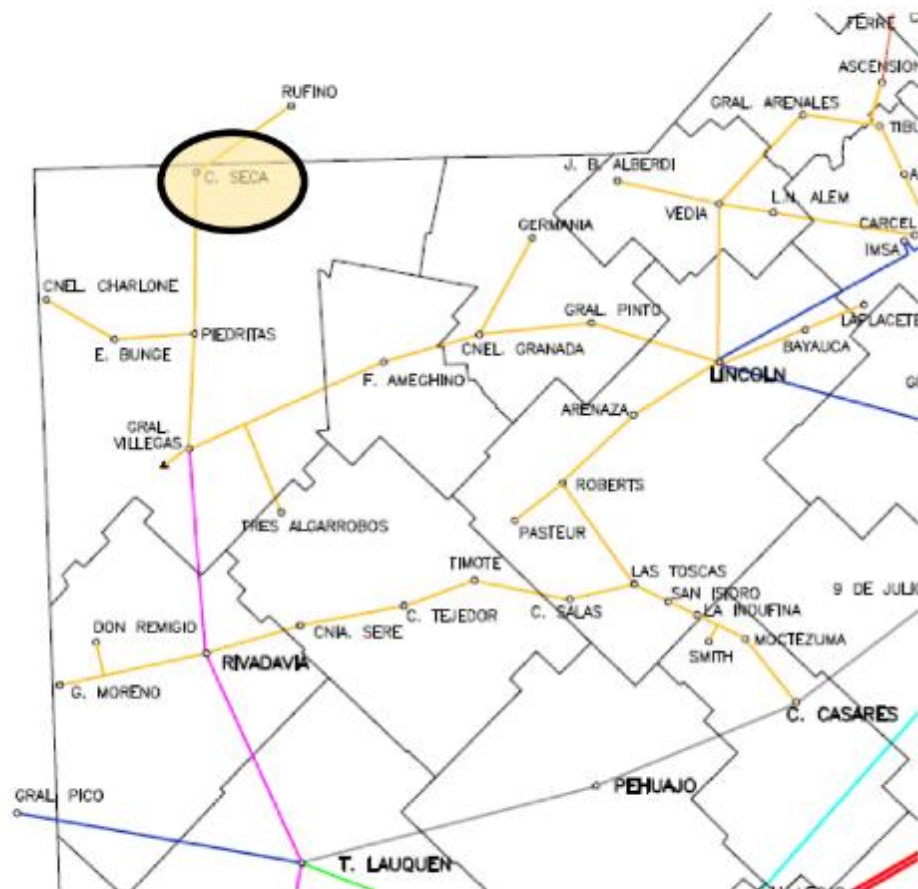

Estado				
Estudios	Piegos	Licitación	Obra	Finalizado
		X		
Instalacion:			Transmisión	
Potencia a instalar:			0	
Km de red a Instalar:			0,0	
Monto de obra Certificado 2019:			\$ 737.810,00	
Monto de obra Certificado Total:			\$ -	
Avance Fisico:			50%	
Localidad Beneficiada:		Cañada Seca - V Saboya - Santa Regina		
Habitantes:			1600	

Obra:

Nueva Estación Transformadora 25 de Mayo 500/132 kV mas LAT 132 kV Asociadas

Nueva Estación Transformadora 25 de Mayo 500/132 kV mas LAT 132 kV 25 de Mayo- Chivilcoy y la apertura de la LAT 132 kV Bragado - Saladillo y conexión a barras de 132 kV de la ET 25 de Mayo



Falta, entre otros, la provisión y disposición en el terreno de la piedra partida.
Pavimentos.
Se comienza con el cableado de comando y protección.
Respecto de la apertura de la LAT Bragado – Saladillo y 25 de Mayo, Chivilcoy, comenzó el montaje de las estructuras y tendido de cable.

Estado

Estudios	Piegos	Licitación	Obra	Finalizado
			X	
Instalacion:			Transmisión	
Potencia a instalar:			600	
Km de red a Instalar:			75,0	
Monto de obra Certificado 2019:			\$ -	
Monto de obra Certificado Total:			\$ 385.136.740,39	
Avance Fisico:			75%	
Localidad Beneficiada:		Centro Oeste Provincia de Buenos Aires		
Habitantes:			1.800.000	






Obra:

Obras del Oeste (Nueva LAT 132 kV Henderson - Pehuajo - G Villegas y Nueva ET Pehuajo 132/66/33/13,2 kV y G villegas 132/33/13,2 kV)

Obras del Oeste (Nueva LAT 132 kV Henderson - Pehuajo - G Villegas y Nueva ET Pehuajo 132/66/33/13,2 kV y G villegas 132/33/13,2 kV)

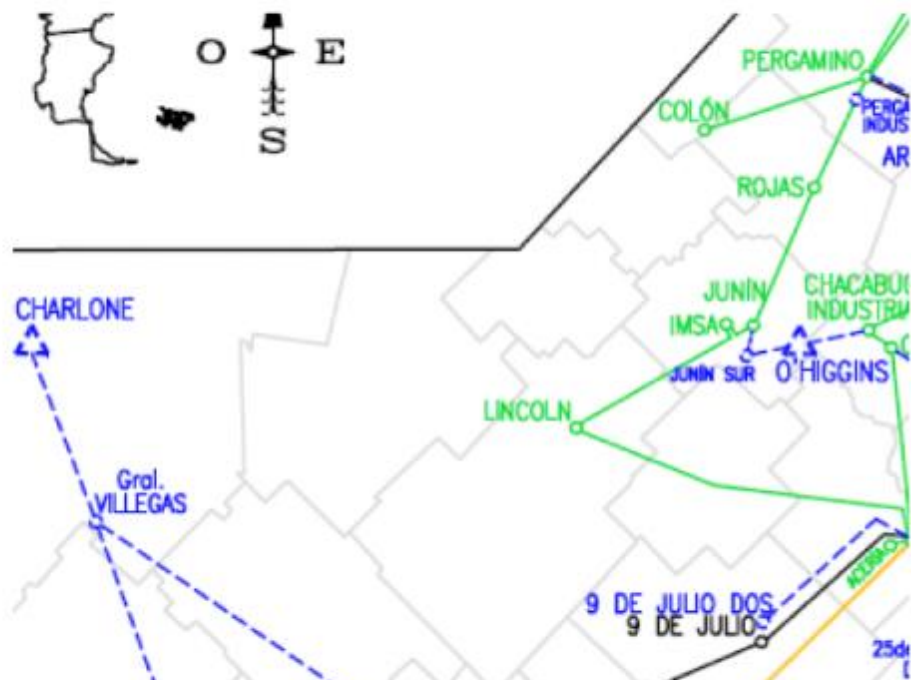

Se reactivó la obra. Se debe continuar con el parado de estructuras, tendido de conductor, y continuar con la construcción de la ET G Villegas.


Estado				
Estudios	Pliegos	Licitación	Obra	Finalizado
			X	
Instalacion:			Transmisión	
Potencia a instalar:			60	
Km de red a Instalar:			140,0	
Monto de obra Certificado 2019:			\$ 190.282.248,97	
Monto de obra Certificado Total:			\$ 437.922.237,13	
Avance Fisico:			63%	
Localidad Beneficiada:		Oeste Provincia de Buenos Aires		
Habitantes:			60000	



Obra:

Ampliación ET 132/33/13,2 kV IMSA - Junín

Ampliación ET IMSA (Junín): Contempla la instalación de un segundo transformador de potencia (T2IM) de 15/10/15 MVA-132/33/13,2 kV y campos asociados, y la construcción de barras de 33 kV.

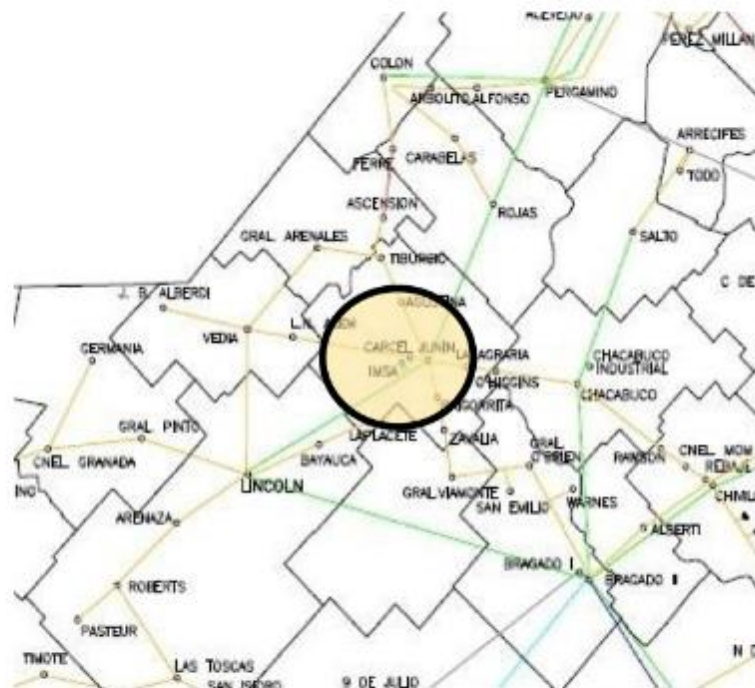

Estado				
Estudios	Pliegos	Licitación	Obra	Finalizado
			X	
Instalacion:			Transmisión	
Potencia a instalar:			15	
Km de red a Instalar:			0,0	
Monto de obra Certificado 2019:			\$ 64.669.205,55	
Monto de obra Certificado Total:			\$ 184.576.963,30	
Avance Fisico:			85%	
Localidad Beneficiada:		Junin		
Habitantes:			87509	


Transformador, equipamiento y tableros montados.
Se está cableando comando y protección.



Obra:

Nueva ET 132/33/13,2 kV San Nicolas Norte y vinculación en 132 kV

Nueva Estacion Transformadora San Nicolas Norte 2x30/20/30 MVA 132/33/13,2 kV mas apertura de las LAT 132 kV San Nicolas - Santa fe

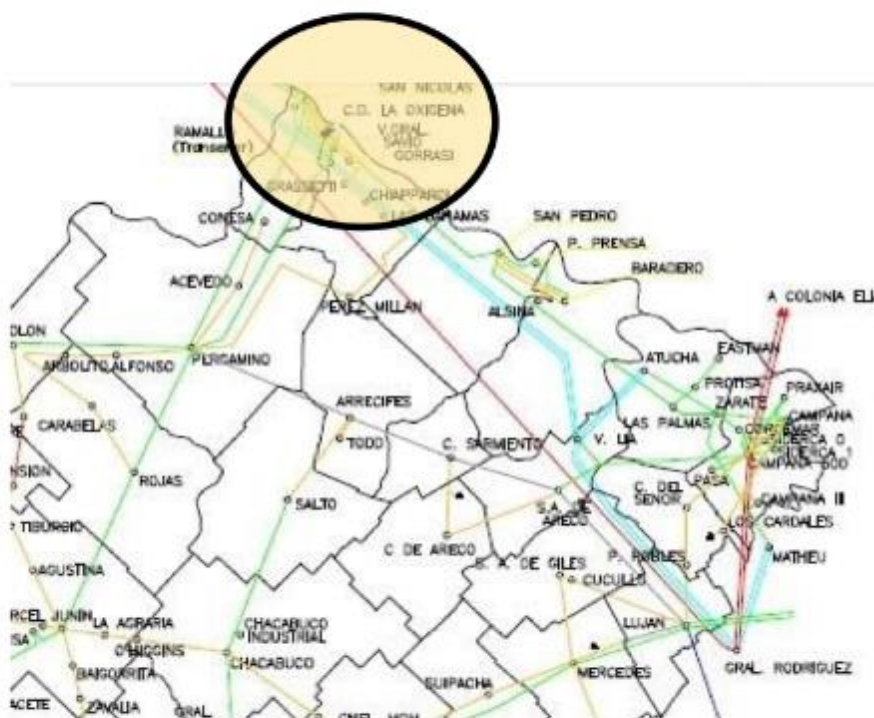

Estado				
Estudios	Pliegos	Licitación	Obra	Finalizado
		X		
Instalacion:			Transmisión	
Potencia a instalar:			80	
Km de red a Instalar:			0,0	
Monto de obra Certificado 2019:			\$ 33.248.546,31	
Monto de obra Certificado Total:			\$ 33.526.546,31	
Avance Fisico:			5%	
Localidad Beneficiada:		San Nicolas - La Emilia - Villa Ramallo		
Habitantes:			178656	



Obra en proceso de licitación, se adquirieron los TR (en construcción) y el terreno.
En diciembre se presentan las ofertas.

Obra:

Nuevas celdas de 13,2 kV en ET 132/33/13,2 kV Campana III (1 celda de 13,2 kV y dos celdas de 33 kV)

Ampliación del tren de celdas de 33 y 3,2 kV en ET Campana II 33/33/3,2 kV, operada y mantenida por TRANSBA, de acuerdo al siguiente detalle: a) una salida de línea 3,2 kV para alimentador, doble barra, compuesta por un interruptor tripolar extraíble de 17,5 kV – 630 A – 25 kA, dos seccionadores tripolar sin carga 3,2 kV – 800 A, un seccionador tripolar P.A.T. de 3,2 kV – 400 A, b) dos salidas de líneas 33 kV para alimentadores, back to back, respetando la arquitectura actual; dos interruptores tripolares extraíbles SF6 - 36 kV – 200 A – 16 kA, un seccionador tripolar sin carga 3,2 kV – 800 A, un seccionador tripolar P.A.T. de 3,2 kV – 400 A, un juego de tres transformadores de corriente 150 – 300/5 -5 A con núcleo de medición clase 0,5 – 30 VA y núcleo de protección clase 5P 10, 60 VA.




Estado				
Estudios	Pliegos	Licitación	Obra	Finalizado
			X	
Instalacion:			Transmisión	
Potencia a instalar:			0	
Km de red a Instalar:			0,0	
Monto de obra Certificado 2019:			\$ -	
Monto de obra Certificado Total:			\$ 3.693.074,73	
Avance Fisico:			90%	
Localidad Beneficiada:		Campana		
Habitantes:			30000	

Obra:

Nuevas celdas de 13,2 kV en ET 132/33/13,2 kV en ET Chivilcoy

Ampliación del tren de celdas de 33 y 13,2 kV en ET Chivilcoy 132/33/13,2 kV, operada y mantenida por TRANSBA, de acuerdo al siguiente detalle: 3 (tres) celdas de 13,2 kV para alimentador, simple barra, compuesta cada una por: un interruptor tripolar extraíble de 13,2 kV – 600 A – 350 MVA, un seccionador tripolar P.A.T. de 17,5 kV – 400 A y un juego de tres TI 200-400/5-5 con un núcleo de medida clase 0,5 – 15 VA y un núcleo de protecciones clase 5P10 – 30 VA.

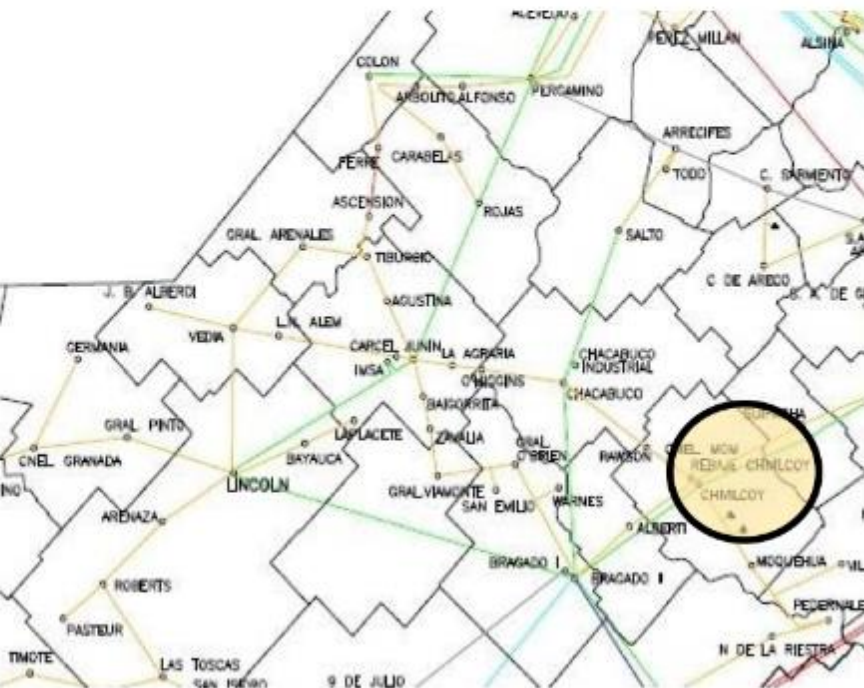

Estado				
Estudios	Pliegos	Licitación	Obra	Finalizado
				X
Instalacion:			Transmisión	
Potencia a instalar:			0	
Km de red a Instalar:			0,0	
Monto de obra Certificado 2019:			\$ 7.016.943,29	
Monto de obra Certificado Total:			\$ 7.016.943,29	
Avance Fisico:			100%	
Localidad Beneficiada:			Chivilcoy	
Habitantes:			9000	

Construcción de una nueva salida de 13,2 kV en la ET Salto




Estado				
Estudios	Pliegos	Licitación	Obra	Finalizado
			X	
Instalación:			Transmisión	
Potencia a instalar:			0	
Km de red a Instalar:			0,0	
Monto de obra Certificado 2019:			\$ 1.291.452,64	
Monto de obra Certificado Total:			\$ 2.120.758,14	
Avance Físico:			20%	
Localidad Beneficiada:		Salto		
Habitantes:			32700	



Obra:

Instalación de nueva celda de 13,2 kV en ET Saladillo. Considera el % de supervisión de TRANSBA

Adquisición, montaje electromecánico y puesta en servicio, de una celda de salida en 13,2 kV a prueba de arco interno, conformada por un sistema de doble juego de barras a instalarse en la ET 132 kV Saladillo.

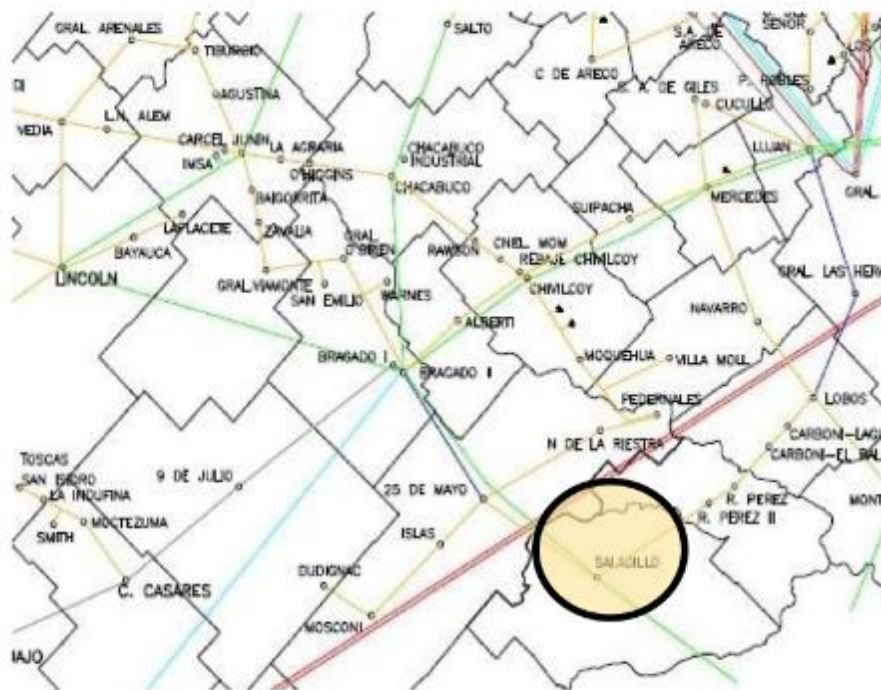

Faltan pruebas.


Estado				
Estudios	Piegos	Licitación	Obra	Finalizado
			X	
Instalación:			Transmisión	
Potencia a instalar:			0	
Km de red a instalar:			0,0	
Monto de obra Certificado 2019:			\$	4.266.615,54
Monto de obra Certificado Total:			\$	4.266.615,54
Avance Físico:			83%	
Localidad Beneficiada:			Saladillo	
Habitantes:			37000	



Obra:

Nueva ET S.A de Areco Dos 132 kV - (1er. Etapa: Puesto de Maniobra y Seccionamiento) y LAT DT 132 kV

Nueva ET S.A. de Areco Dos 132 kV (PMYS): La obra contempla la construcción de doble juego de barra en U y tres campos de salida de línea en 132 kV. La nueva Estación de maniobras se vinculará al Sistema de Transporte mediante el seccionamiento de la LATV. Lia - S.A. de Areco en las cercanías de la actual ET S.A. de Areco, considerándose además la construcción de un tramo de LAT 132 kV en doble terna de unos 5 km de longitud hasta barras de la ET S.A. de Giles.

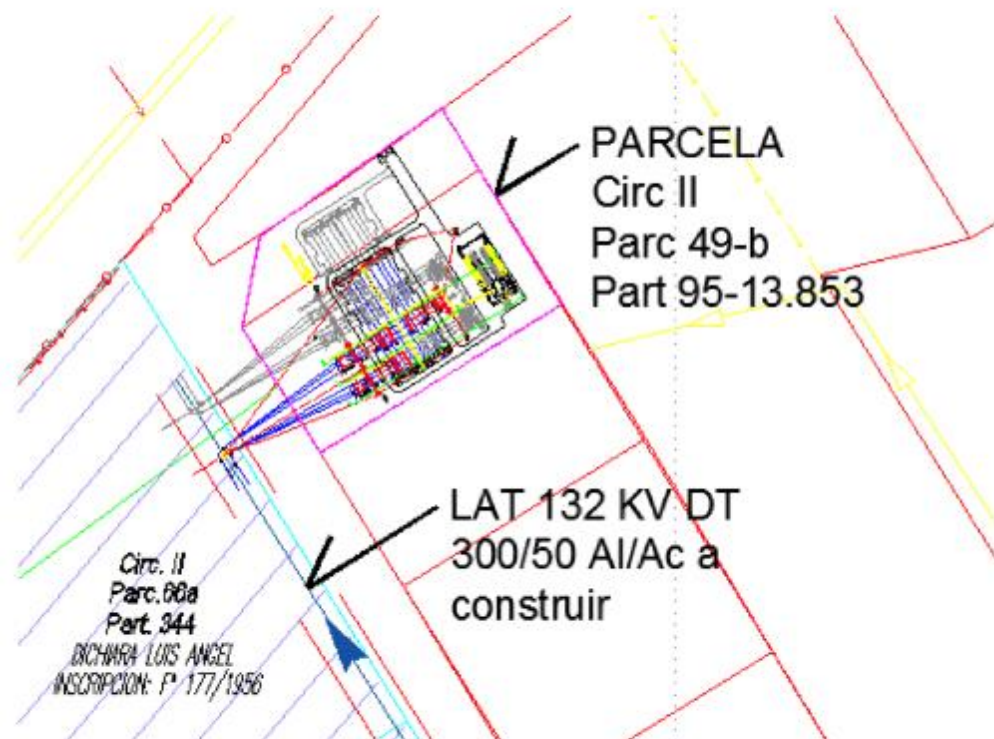


Etapas de confección de pliegos. Terreno para la ET adquirido.

Estado				
Estudios	Pliegos	Licitación	Obra	Finalizado
	X			
Instalacion:			Transmisión	
Potencia a instalar:			0	
Km de red a Instalar:			0,0	
Monto de obra Certificado 2019:			\$ 16.611.486,40	
Monto de obra Certificado Total:			\$ 16.611.486,40	
Avance Fisico:			0%	
Localidad Beneficiada:		San Antonio de Areco - Carmen de Areco - San Andres de Giles		
Habitantes:			52132	

Obra:

Nueva ET 132/33/13,2 kV Nueve de Julio y LAT de 132 kV asociada

Construcción de una nueva Estación Transformadora de 132/33/13,2 kV de 2x30/20/30 MVA y un campo de salida de línea en 132 kV. Construcción de LAT 132 kV ET Bragado-ET Nueve de Julio, conductor de 300/50 mm² Al/Ac, 71 km de longitud. Construcción de un campo de salida de línea en 132 kV en la ET Bragado.

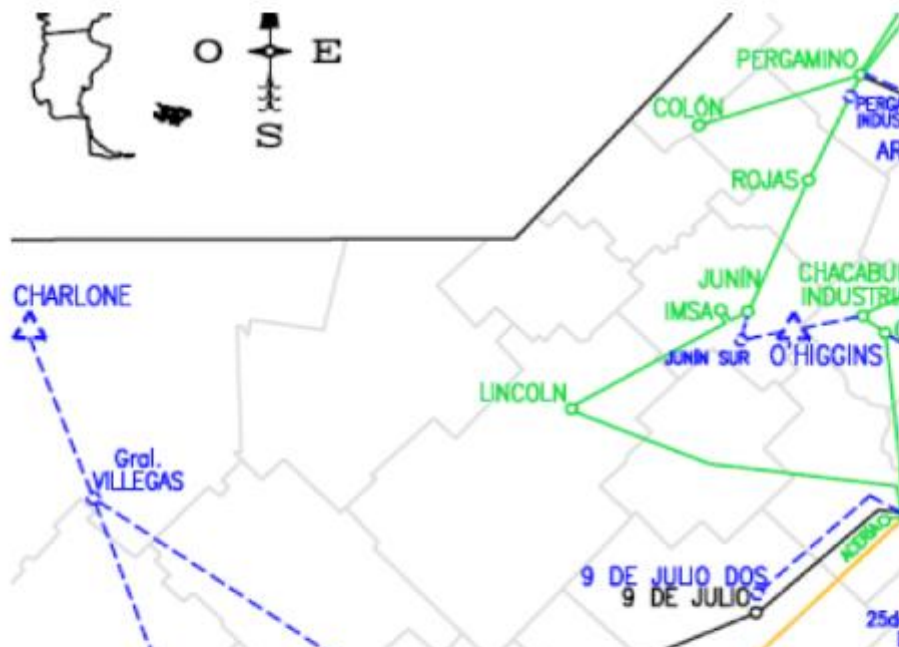

Etapas de estudios y confección de pliegos. Se está finalizando informe factibilidad para la línea de 132 kV desde la ET de Mayo.

Estado				
Estudios	Pliegos	Licitación	Obra	Finalizado
X				
Instalacion:			Transmisión	
Potencia a instalar:			0	
Km de red a Instalar:			120,0	
Monto de obra Certificado 2019:			\$ 786.317,39	
Monto de obra Certificado Total:			\$ 786.317,39	
Avance Fisico:			0%	
Localidad Beneficiada:		9 DE Julio - C Casares - Bragado - 25 de Mayo		
Habitantes:			80000	

Obra:

Nueva ET Chivilcoy II 132/33/13,2 kv

Nueva ET Chivilcoy II 2x30/20/30 MVA 132/33/13,2 kv mas LAT 132 kv Chivilcoy - Chivilcoy II: Costos asociados a los conceptos correspondientes a proyectos, estudios eléctricos, estudios de impacto ambiental, liberación de trazas, adquisición de terrenos, elaboración de pliegos y supervisión por parte del transportista, de la obra a ser ejecutada por la provincia de Buenos Aires con destino a la expansión de la red de transporte eléctrico provincial Nueva ET 132 KV Chivilcoy II y Vinculación 132 KV Punto Secc. LAT 25 de Mayo-Chivilcoy y ET Chivilcoy II, resulta financiable a través del Fondo de Inversión en Transmisión de la Provincia




OBRA A EJECUTARSE POR DEBA CON FONDOS CAF.
Terreno adquirido. Se realizaron Estudios y Pliegos.

Estado				
Estudios	Pliegos	Licitación	Obra	Finalizado
	X			
Instalacion:			Transmisión	
Potencia a instalar:			60	
Km de red a Instalar:			0,0	
Monto de obra Certificado 2019:			\$ 2.461.131,00	
Monto de obra Certificado Total:			\$ 2.461.131,00	
Avance Fisico:			0%	
Localidad Beneficiada:		Chivilcoy		
Habitantes:			70000	

Obra:

Ampliación ET 132/33/13,2 kV Lincoln

Ampliación ET LINCOLN (Finalización): Reemplazo de dos Transformadores 15/10/15 MVA 132/33/13,2 kV por dos de 30/20/30 MVA Adecuaciones y reemplazo de de equipos existentes.

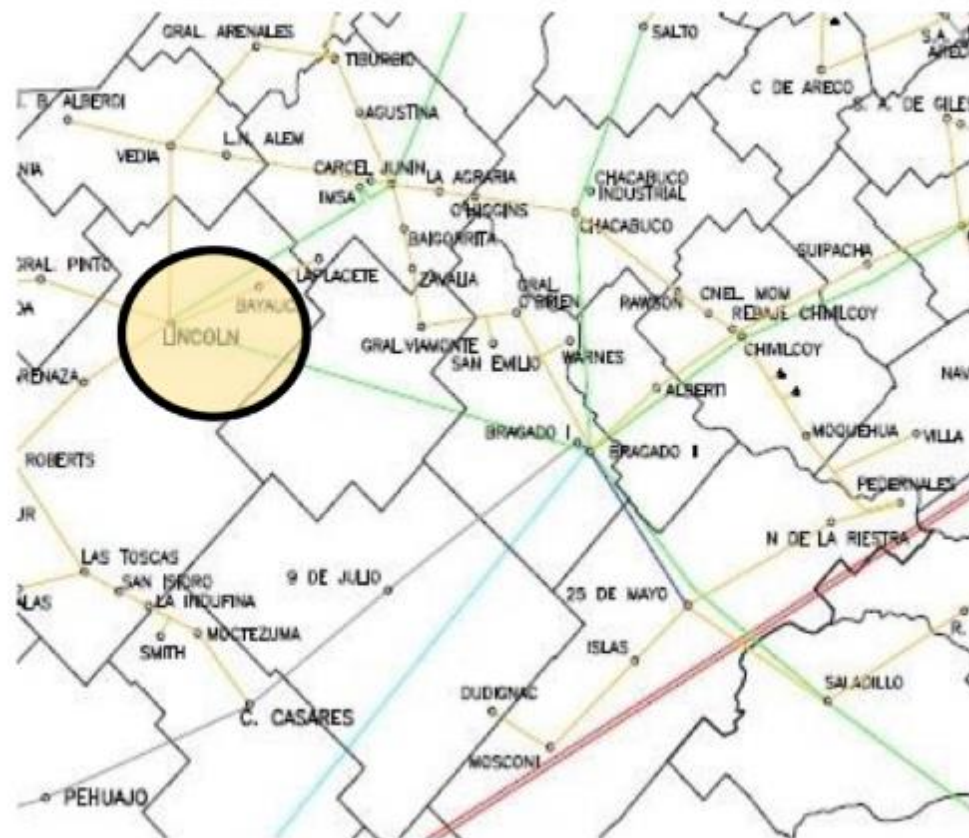


Estado				
Estudios	Piegos	Licitación	Obra	Finalizado
			X	
Instalacion:			Transmisión	
Potencia a instalar:			60	
Km de red a Instalar:			0,0	
Monto de obra Certificado 2019:			\$ 11.528.467,64	
Monto de obra Certificado Total:			\$ 19.442.471,52	
Avance Fisico:			100%	
Localidad Beneficiada:		Lincoln		
Habitantes:			50000	

Obra:

Nueva ET San Andres de Giles 132 / 33 / 13,2 kV y vinculaciones

Nueva ET SA de Giles 2x30/20/30 MVA 132/33/13,2 kv mas LAT 132 kV SA de Giles - SA de Areco II: Costos asociados a los conceptos correspondientes a proyectos, estudios eléctricos, estudios de impacto ambiental, liberación de trazas, adquisición de terrenos, elaboración de pliegos y supervisión por parte del transportista, de la obra a ser ejecutada por la provincia de Buenos Aires con destino a la expansión de la red de transporte eléctrico provincial Nueva ET 132 kV S.A. de Giles y Vinculación 132 kV S.A. de Areco II y S.A. de Giles, resulta financiable a través del Fondo de Inversión en Transmisión de la Provincia de Buenos Aires (FITBA).

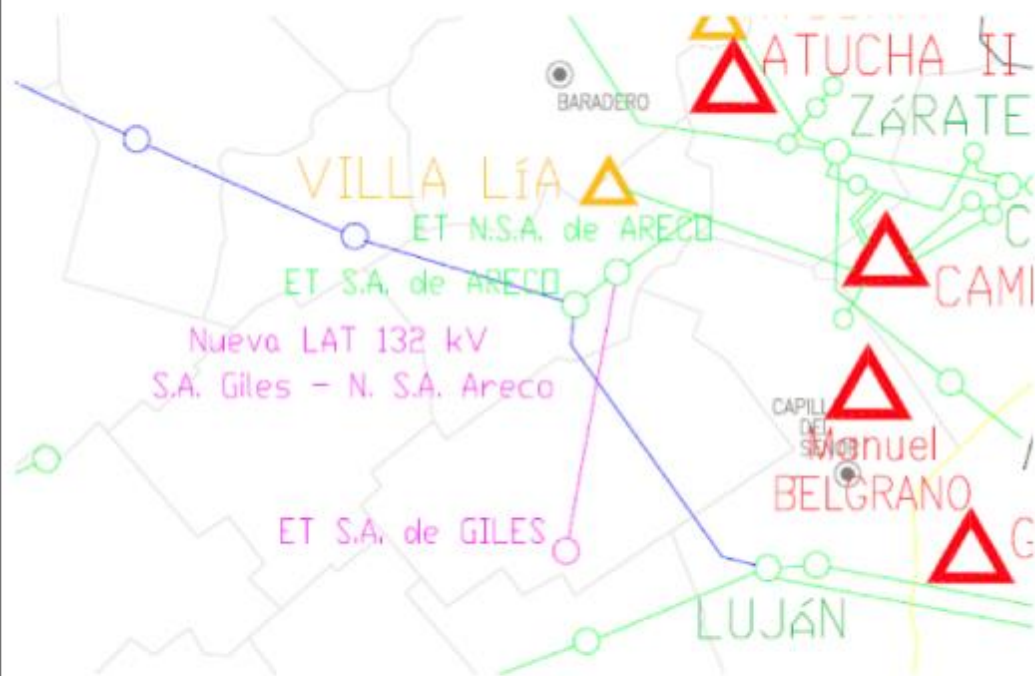


OBRA A EJECUTARSE POR DEBA CON FONDOS CAF.
Terreno para ET adquirido. Se realizaron Estudios y Pliegos.

Estado				
Estudios	Pliegos	Licitación	Obra	Finalizado
	X			
Instalacion:			Transmisión	
Potencia a instalar:			60	
Km de red a Instalar:			0,0	
Monto de obra Certificado 2019:			\$ 3.685.214,90	
Monto de obra Certificado Total:			\$ 3.685.214,90	
Avance Fisico:			0%	
Localidad Beneficiada:		San andres de Giles		
Habitantes:			45000	

Obra:

Canon Ampliaciones Res. SE 01/03 - Ampliacion ET Henderson -


0

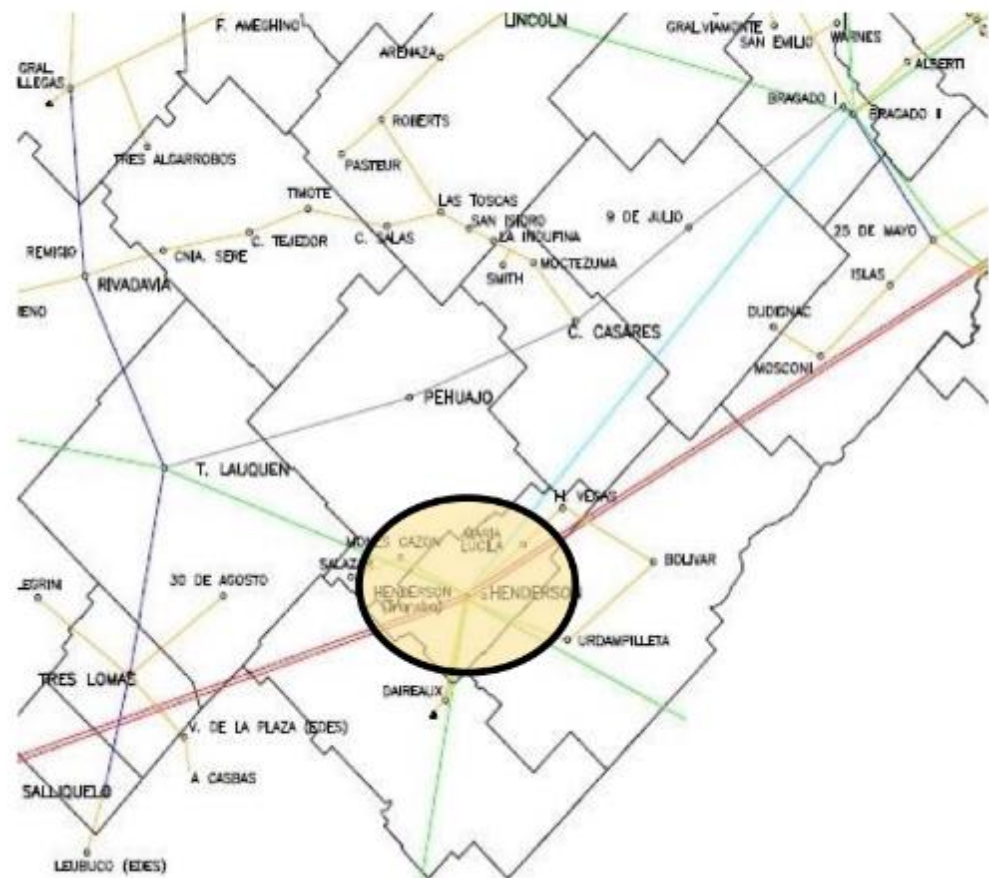

Estado				
Estudios	Piegos	Licitación	Obra	Finalizado
				X
Instalacion:			Transmisión	
Potencia a instalar:			0	
Km de red a Instalar:			0,0	
Monto de obra Certificado 2019:			\$ 2.265.353,22	
Monto de obra Certificado Total:			\$ 26.934.154,29	
Avance Fisico:			100%	
Localidad Beneficiada:		Centro Oeste de Provincia de Buenso Aires		
Habitantes:			300000	

Obra:

Construcción de línea de media tensión troncal de Salto – Gahan, 17 km

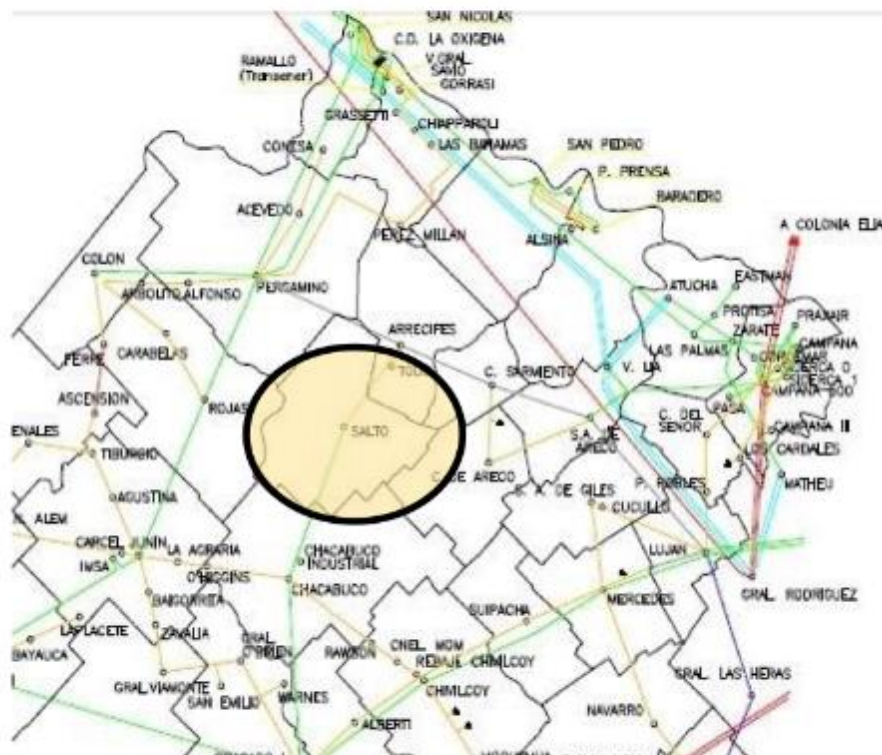

Estado				
Estudios	Pliegos	Licitación	Obra	Finalizado
Instalacion:			Transmisión	
Potencia a instalar:			0	
Km de red a instalar:			0,0	
Monto de obra Certificado 2019:			\$	85.847,90
Monto de obra Certificado Total:			\$	717.033,31
Avance Fisico:			100%	
Localidad Beneficiada:			Gahan	
Habitantes:			700	

Obra ejecutada con fondos FEDEI. Desde FREBA se pagaron cuotas préstamo.


REGIÓN SUR

175 MM\$ invertidos en 2019

Obra:

Nueva ET 33/13,2 kV Cabildo

Construcción de Nueva ET Cabildo 33/13,2kV en proximidades a Barrios Parques de Bahía Blanca.

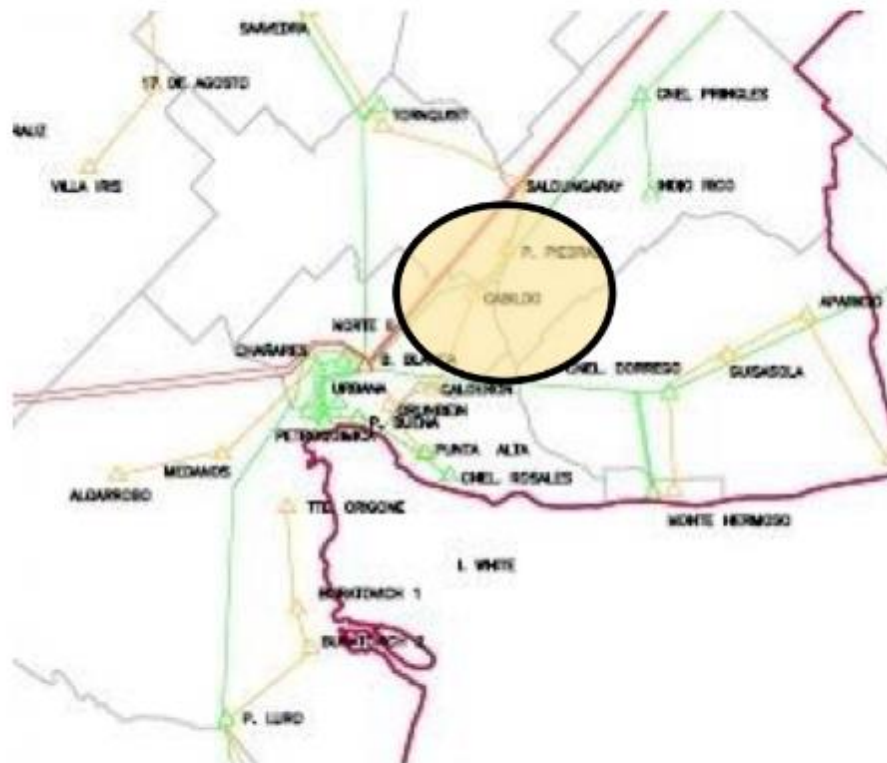


Estado				
Estudios	Pliegos	Licitación	Obra	Finalizado
			X	
Instalacion:			Sub-Transmision	
Potencia a instalar:			0	
Km de red a Instalar:			0,0	
Monto de obra Certificado 2019:			\$ -	
Monto de obra Certificado Total:			\$ 2.553.775,91	
Avance Fisico:			20%	
Localidad Beneficiada:		Cabildo		
Habitantes:			2046	

Se adquirió transformador.

Obra:

Ampliación ET 33/13,2 kV "A" Bahía Blanca

Reemplazo del equipamiento total de la ET "A" por celdas tipo compactas para instalación del segundo transformador de 10 MVA- Mejoras de los tiempos de reposición, calidad de servicio y seguridad operativa de las instalaciones

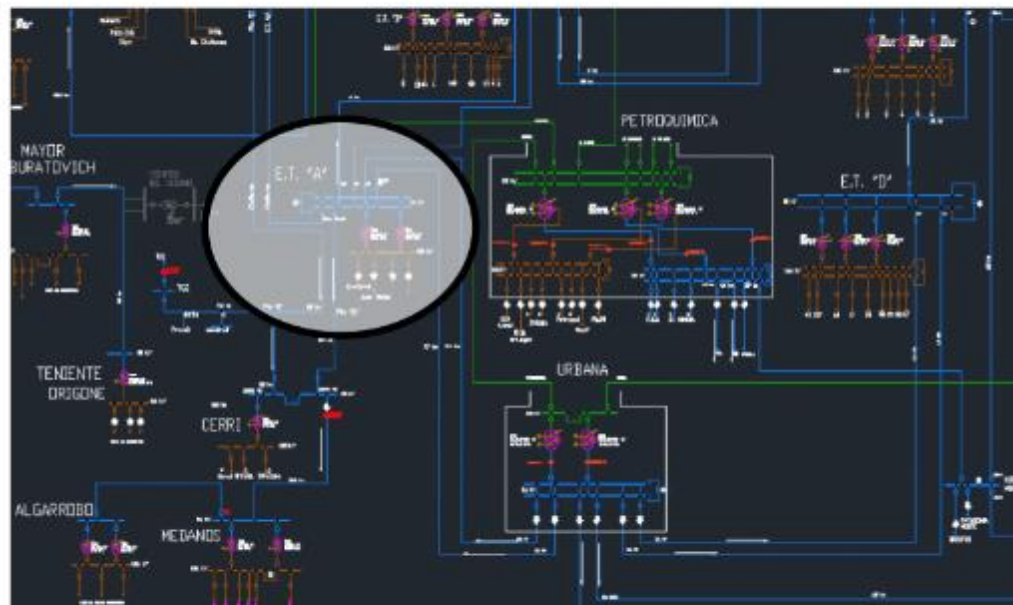

Se adquirió el tren de celdas.


Estado

Estudios	Pliegos	Licitación	Obra	Finalizado
			X	
Instalacion:			Sub-Transmision	
Potencia a instalar:			0	
Km de red a Instalar:			0,0	
Monto de obra Certificado 2019:			\$ 10.762.352,62	
Monto de obra Certificado Total:			\$ 25.550.279,32	
Avance Fisico:			83%	
Localidad Beneficiada:		Bahia Blanca		
Habitantes:			30000	

Obra:

Nueva ET 33/13,2 kV "F" Bahía Blanca

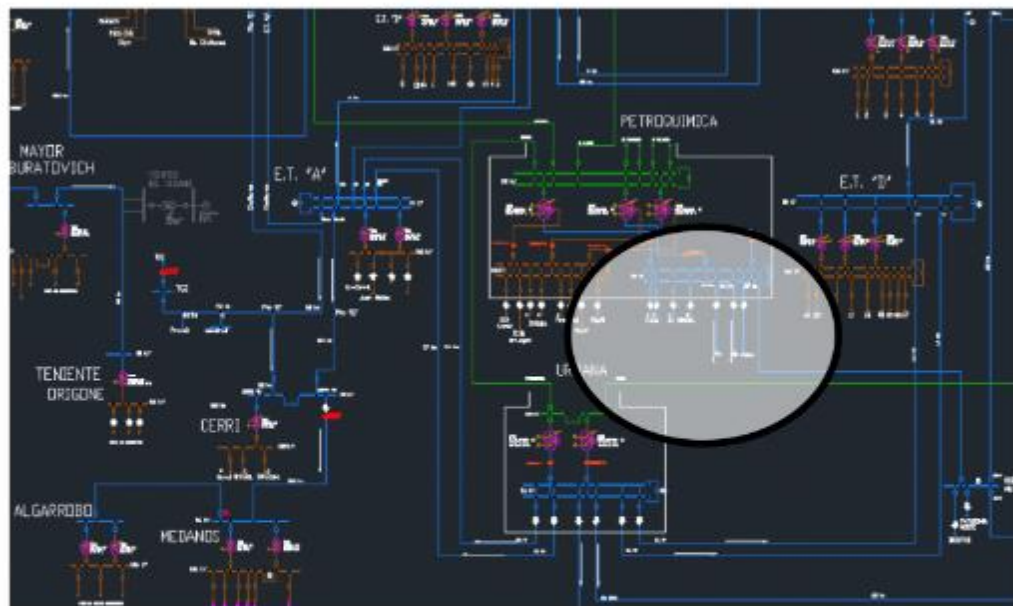

Construcción de nuevo centro de distribución ET F 33/13,2 kV, sobre traza de alimentador 306



Estado				
Estudios	Piegos	Licitación	Obra	Finalizado
			X	
Instalacion:			Sub-Transmision	
Potencia a instalar:			10	
Km de red a Instalar:			0,0	
Monto de obra Certificado 2019:			\$ 17.210.473,57	
Monto de obra Certificado Total:			\$ 21.361.453,57	
Avance Fisico:			81%	
Localidad Beneficiada:		Bahia Blanca		
Habitantes:			30000	

Se montó transformador y aparatos.




	Nueva ET 33/13,2 kV Nicolas Levalle (Las Salinas)				
Obra:	Nueva ET de 33/13,2kV en inmediaciones de la ruta Nac 22 con el camino de acceso a Chapalcó para la mejora de producto y Servicio de la zona.				
					
Se construyó la batea para el TR.					
					

Se construyó la batea para el TR.

Obra:

Ampliación ET 33/13,2 kV Pehuen Co

Repotenciación de la ET Pehuen-Co mediante el reemplazo de uno de los transformadores de 1,6 MVA 33/13,2 kV sin RBC por otro 1 x 5 MVA con RBC y adecuación de los campos de transformación, instalaciones electromecánicas complementarias y accesorios.

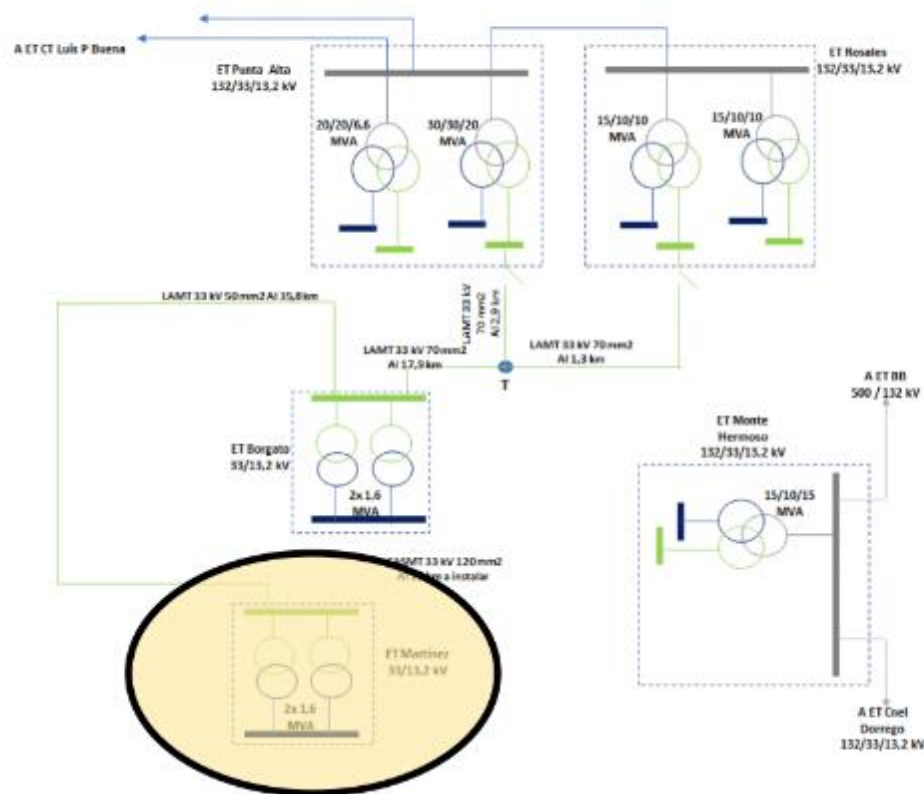

Estado				
Estudios	Pliegos	Licitación	Obra	Finalizado
				X
Instalacion:			Sub-Transmision	
Potencia a instalar:			5	
Km de red a Instalar:			0,0	
Monto de obra Certificado 2019:			\$ -	
Monto de obra Certificado Total:			\$ 2.581.347,12	
Avance Fisico:			100%	
Localidad Beneficiada:		Pehuen Co		
Habitantes:			5000	



Obra:

Ampliación ET Puan 33/13,2 kV

Ampliación ET 33/13,2 kV Puan -Reemplazo transformadores 2x2,5 MVA por 2x10 MVA, 2 campos de entrada de línea de 33 kv, 2 campos de transformción 33/13,2 kV, 1 campo salida de 13,2 kV, Ser. Auxiliares y obras complementarias y vinculación 33 kv de ET 132 kV Púan a LMT Azopardo, vinculación 33 kv ET 132 kV Púan a LMT Coop.Púan, CAS DT 33 kv 125 mts y CAS DT 33 kv 1.300 mts.




Estado				
Estudios	Piegos	Licitación	Obra	Finalizado
				X
Instalacion:			Sub-Transmision	
Potencia a instalar:			20	
Km de red a Instalar:			0,0	
Monto de obra Certificado 2019:			\$ 2.468.381,98	
Monto de obra Certificado Total:			\$ 5.729.998,22	
Avance Fisico:			100%	
Localidad Beneficiada:		Puan		
Habitantes:			15600	

Ampliación ET Huanguelen 33/13,2 Kv

Obra:

Instalación de boosters de 13,2 kV en la ET 33/13,2kV Huanguelén

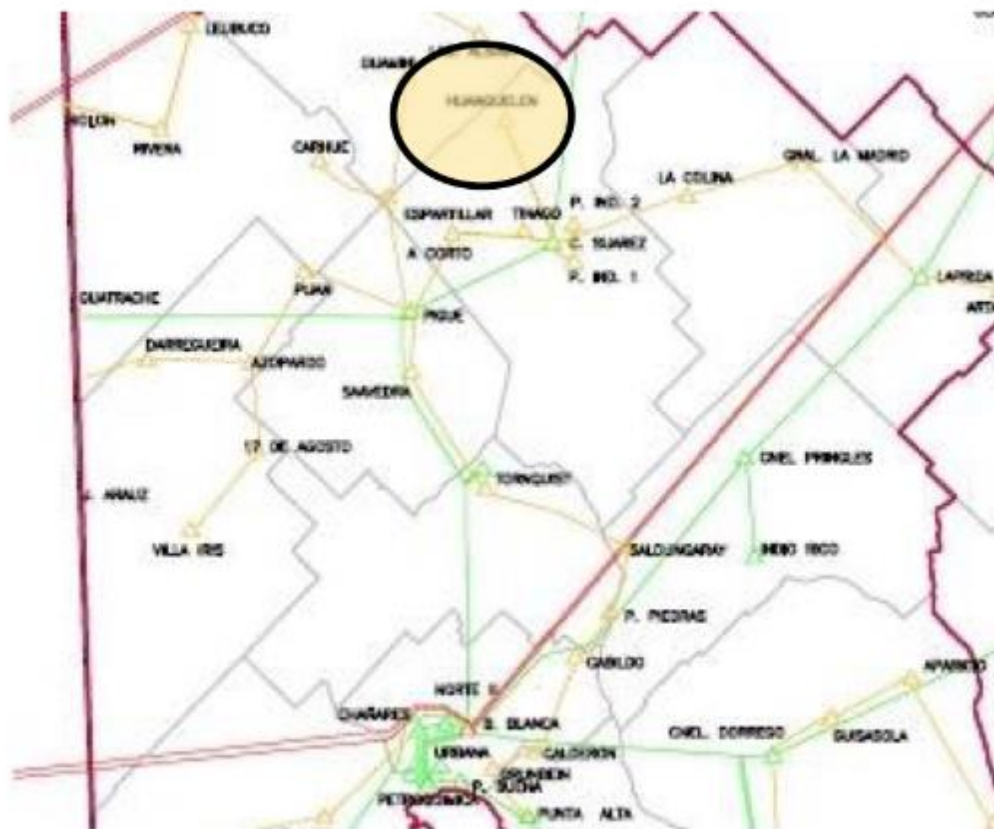


Estado				
Estudios	Pliegos	Licitación	Obra	Finalizado
				X
Instalacion:			Sub-Transmision	
Potencia a instalar:			0	
Km de red a Instalar:			0,0	
Monto de obra Certificado 2019:			\$ 2.065.741,67	
Monto de obra Certificado Total:			\$ 5.817.856,84	
Avance Fisico:			100%	
Localidad Beneficiada:		Huanguelen		
Habitantes:			5020	

Obra:

ET 33/13,2 kV Sierra de La Ventana

Estación Transformadora 33/13,2kV-3,75+3,75MVA

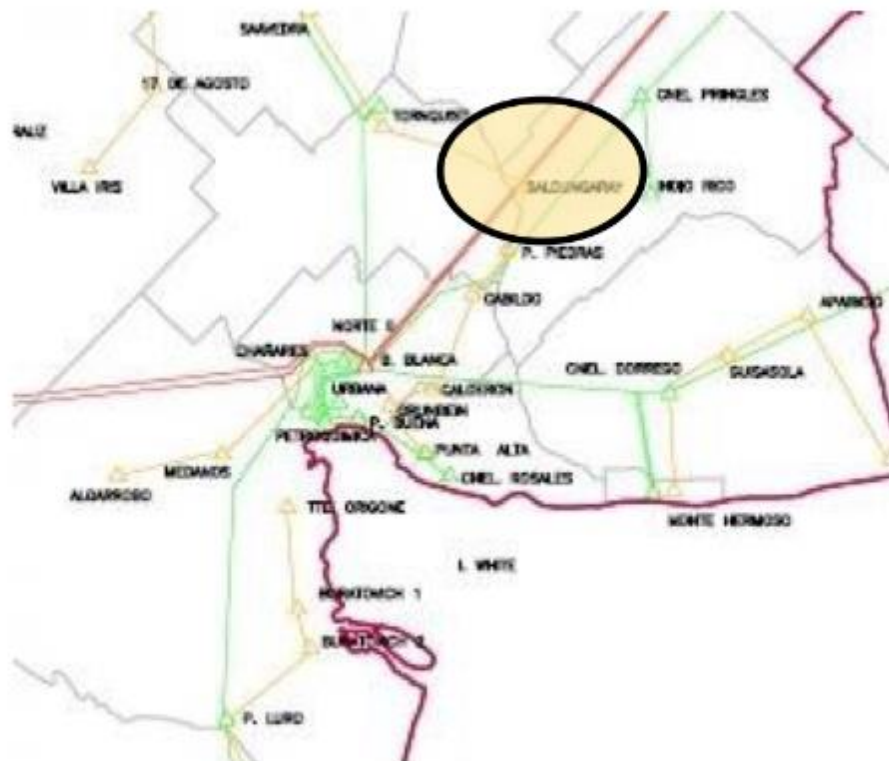

Estado				
Estudios	Pliegos	Licitación	Obra	Finalizado
				X
Instalacion:			Sub-Transmision	
Potencia a instalar:			7,5	
Km de red a Instalar:			2,0	
Monto de obra Certificado 2019:			\$ -	
Monto de obra Certificado Total:			\$ 4.102.280,19	
Avance Fisico:			100%	
Localidad Beneficiada:		Sierra de la Ventana y Villa La Arcadia		
Habitantes:			16000	



Obra:

Nueva ET 132/33/13,2 kV Bahía Blanca Sur y vinculación en 132 kV

Construcción de nueva ET 2 x 45/30/45 MVA - 132/33/13,2 kV y obras de 13,2 y 33 kV asociadas, más construcción de dos campos de salida de línea 132 kV para su vinculación al Sistema de Transporte por Distribución Troncal y el Seccionamiento LAT 132 KV Chañares - Petroquímica (a la espera del Conv y nec publica del enre, ya lleva mas de 1 año)



Estado				
Estudios	Pliegos	Licitación	Obra	Finalizado
			X	
Instalacion:			Sub-Transmision	
Potencia a instalar:			90	
Km de red a instalar:			0,0	
Monto de obra Certificado 2019:			\$	120.503.241,49
Monto de obra Certificado Total:			\$	139.274.501,05
Avance Fisico:			5%	
Localidad Beneficiada:			Bahia Blanca	
Habitantes:			90000	


Se está realizando movimientos de suelos y ensayos de los transformadores.



Obra:


Ampliación de ET 132/33/13,2 kV Urbana Bahía Blanca (nueva celda)

Construcción de una nueva salida en 33 kv en ET 132 kV urbana (Bahía Blanca), montaje del equipamiento de maniobra y medición sobre postes existentes y obras civiles y complementarias, campo de salida de línea con medición SMEC y otras provisiones electromecánicas

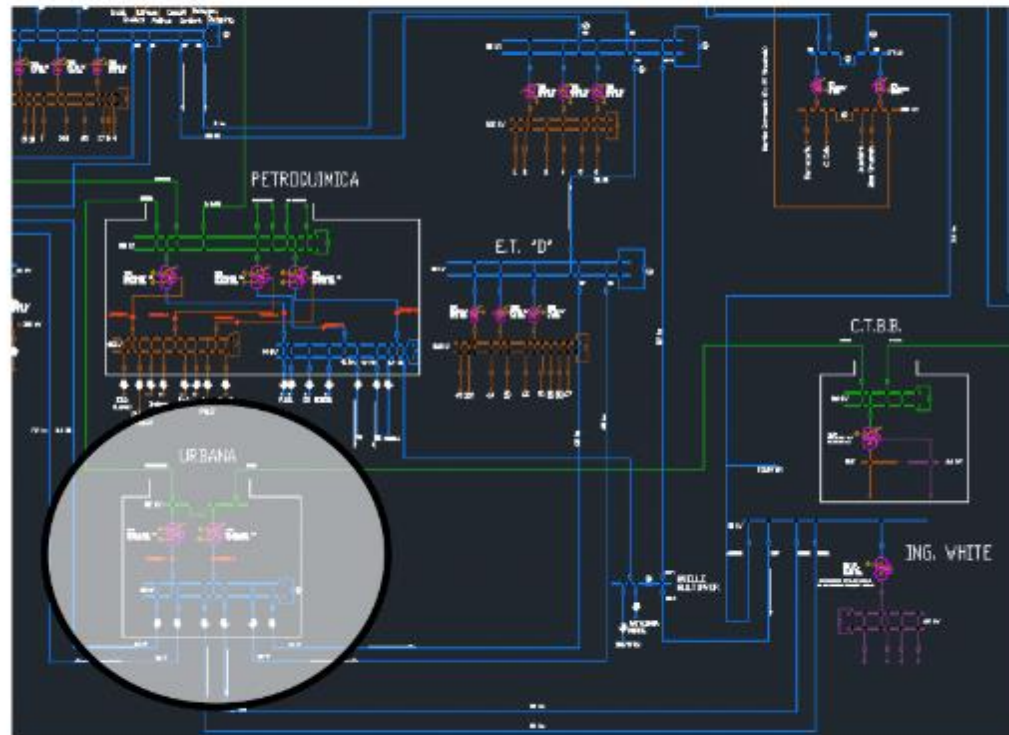

Estado				
Estudios	Pliegos	Licitación	Obra	Finalizado
			X	
Instalacion:			Sub-Transmision	
Potencia a instalar:			0	
Km de red a Instalar:			0,0	
Monto de obra Certificado 2019:			\$ 451.914,92	
Monto de obra Certificado Total:			\$ 451.914,92	
Avance Fisico:			0%	
Localidad Beneficiada:		Bahia Blanca		
Habitantes:			30000	

Obra:	Ampliación de ET 132/33/13,2 kV Carmen de Patagones				
	Ampliacion de ET C. de Patagones 132ckV consistente en la construcción del sistema de barras de 33 kV y adecuación sistema telecontrol.				

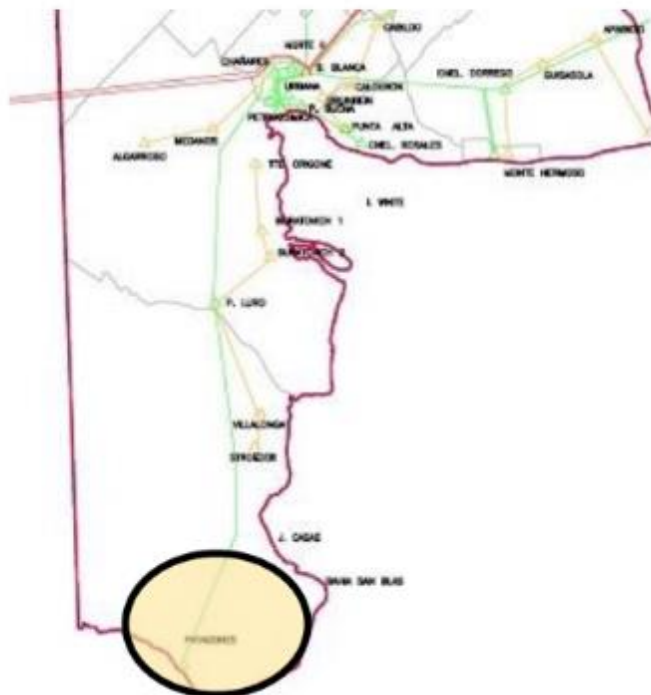

Estado				
Estudios	Pliegos	Licitación	Obra	Finalizado
			X	
Instalacion:			Transmision	
Potencia a instalar:			0	
Km de red a Instalar:			0,0	
Monto de obra Certificado 2019:			\$ 17.188.954,94	
Monto de obra Certificado Total:			\$ 17.707.446,94	
Avance Fisico:			5%	
Localidad Beneficiada:			Carmen de Patagoes	
Habitantes:			20533	


Obra adjudicada, se pagó anticipo.

Obra adjudicada, se pagó anticipo.

Nueva ET Guamini 132/33/13,2 kV

Obra:

Costos asociados a los conceptos correspondientes a proyectos, estudios eléctricos, estudios de impacto ambiental, liberación de trazas, adquisición de terrenos, elaboración de pliegos y supervisión por parte del transportista, de la obra a ser ejecutada por la provincia de Buenos Aires con destino a la expansión de la red de transporte eléctrico provincial Nueva ET 132 kV Guaminí y IAT 132 kV Cnel. Suárez--Guaminí, resulta financiable a través del Fondo de Inversión en Transmisión de la Provincia de Buenos Aires (FITBA).

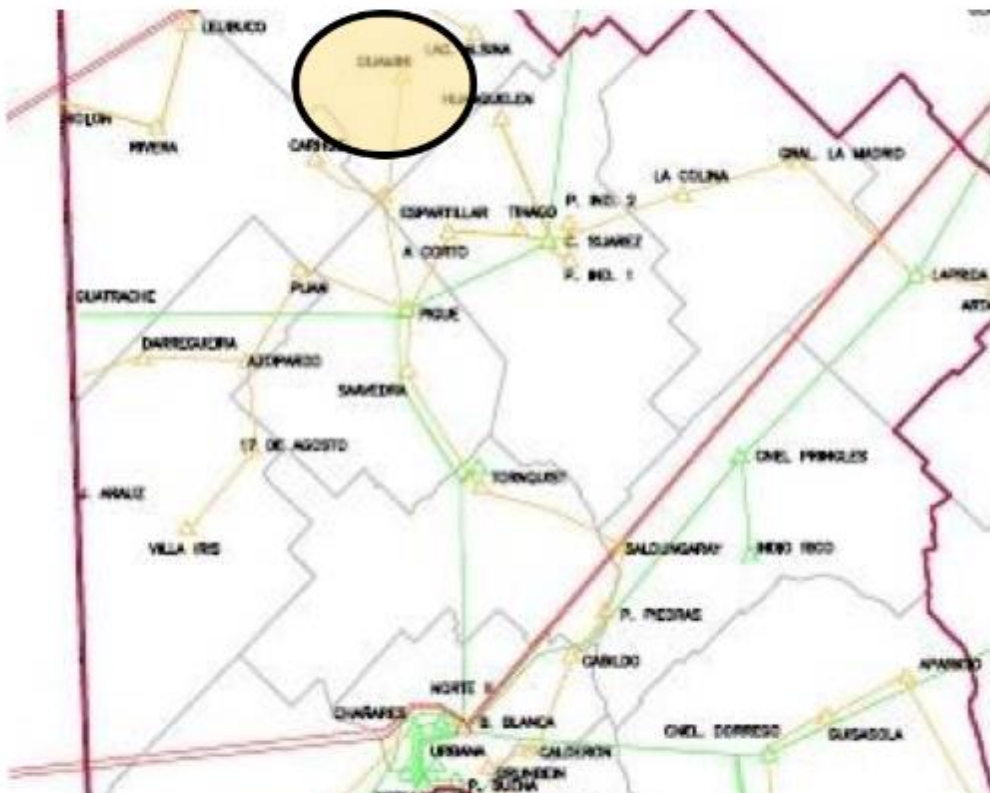


Estado				
Estudios	Pliegos	Licitación	Obra	Finalizado
	X			
Instalacion:			Sub-Transmision	
Potencia a instalar:			60	
Km de red a Instalar:			0,0	
Monto de obra Certificado 2019:			\$ 3.996.151,32	
Monto de obra Certificado Total:			\$ 3.996.151,32	
Avance Fisico:			0%	
Localidad Beneficiada:		Guamini		
Habitantes:			2845	

OBRA A EJECUTARSE POR DEBA CON FONDOS CAF.
Se adquirió terreno. Estudios y Pliegos entregados.

Obra:

Ampliación Estación Transformadora Coronel Suarez 132/33/13,2 kV

Ampliación de capacidad ET Coronel Suárez 132/33/13 2 kV, reemplazando los dos transformadores existentes de 15/10/15 MVA por dos de 30/30/20 MVA, e iguales relaciones de transformación más adecuaciones en campos, celdas y en los sistemas de telecontrol y protecciones

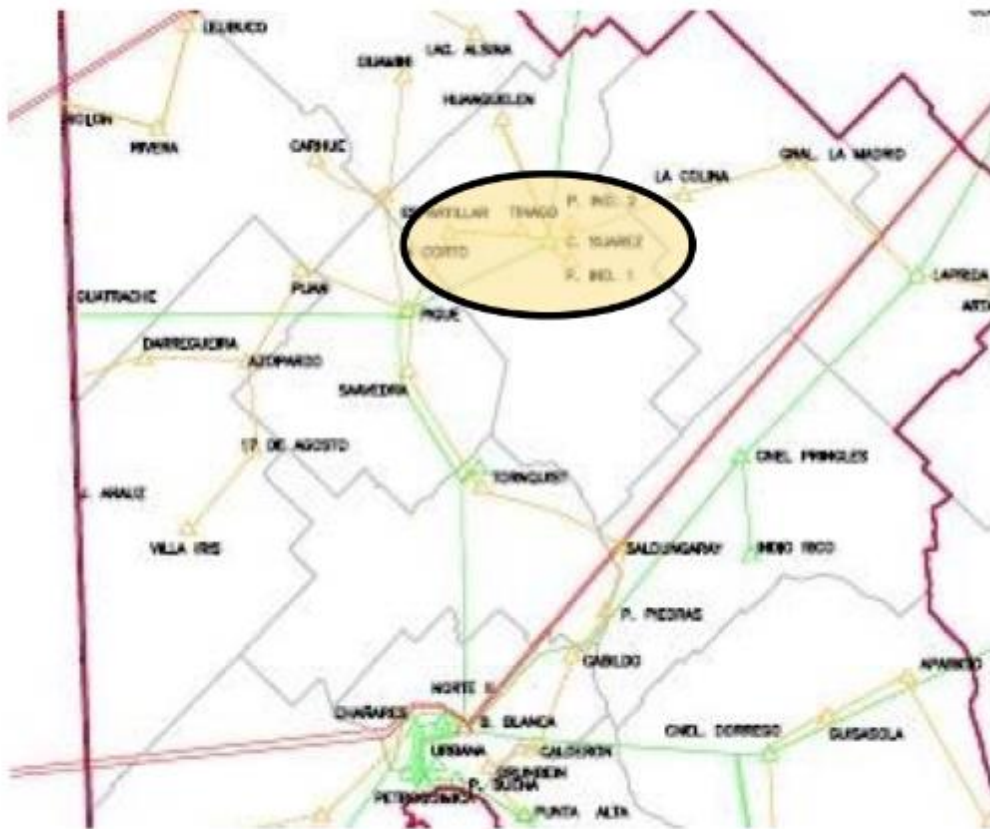

Se adquirieron los transformadores.

Estado

Estudios	Pliegos	Licitación	Obra	Finalizado
X				
Instalacion:			Sub-Transmision	
Potencia a instalar:			60	
Km de red a Instalar:			0,0	
Monto de obra Certificado 2019:			\$ 503.000,00	
Monto de obra Certificado Total:			\$ 14.326.568,31	
Avance Fisico:			0%	
Localidad Beneficiada:		C Suarez - Espartillar - Huanguelen		
Habitantes:			32560	
